REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 34 del 20/01/2025

Seduta Num. 3

Questo lunedì 20 **del mese di** Gennaio

dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/56 del 15/01/2025

Struttura proponente: SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SOTTOSCRITTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE - APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE RIMODULAZIONI 2024

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Gamberini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce lo strumento dell'Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR"), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 13 luglio 2021 e successivamente modificato con le Decisioni di esecuzione del Consiglio Europeo del 5 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 18 novembre 2024;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022, recante "PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale", con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato il Piano Operativo della Regione Emilia-Romagna (di seguito anche "Piano Operativo"), quale parte integrante e sostanziale del Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS);
- in attuazione dell'art. 3, comma 2, CIS, è stato nominato quale Referente unico della parte per la Regione Emilia-Romagna, l'Ing. Luca Baldino, Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna;

Richiamato, altresì, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, comprensivo del Piano Operativo e dei suoi allegati, sottoscritto in data 31 maggio 2022 (protocollo 0511645.U del 31.05.2022) e successivamente approvato con Decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022;

Evidenziato che con l'atto amministrativo n. 3065 del 15/02/2024 sono state formalmente recepite le rimodulazioni al suddetto Piano approvate fino a tutto il 2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo, la Regione, nella sua qualità di Soggetto attuatore, in conformità alle istruzioni operative diramate dall'Unità di Missione con nota prot. 0002104-28/10/2022-UMPNRR-P, ha avanzato anche nel corso del 2024 specifiche istanze di rimodulazione del Piano Operativo;

Preso atto delle positive valutazioni espresse dal Nucleo Tecnico, ai sensi dell'art. 8 del citato Contratto, come da verbali trasmessi dall'Ufficio I dell'Unità di Missione, agli atti dell'Area Monitoraggio attuazione interventi PNRR;

Preso altresì atto che le istanze di rimodulazione proposte sono successivamente state sottoposte, per la formale approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del Contratto, al Tavolo istituzionale e che, non essendo pervenute segnalazioni di motivazioni ostative per la finalizzazione dell'iter di aggiornamento documentale delle rimodulazioni del Piano Operativo, le stesse sono state accolte e perfezionate come si evince da ciascuna comunicazione inoltrata dal Ministero della Salute - Ufficio I dell'Unità di Missione, acquisite agli atti con i seguenti protocolli:

- n. 0232062.E del 05/03/2024;
- n. 0556458.E del 30/05/2024;
- n. 0851801.E del 06/08/2024;
- n. 1305867.E del 26/11/2024;
- n. 1398959.E del 31/12/2024.

Richiamata la nota trasmessa dal Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria, acquisita agli atti con prot. 08.01.2025.0008658.E, che a sua volta approva, per quanto di competenza, la rimodulazione di cui all'ultima delle note citate e relativa al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle rimodulazioni richieste ed accolte nell'anno 2024 e di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il Piano Operativo aggiornato allegato al Contratto istituzionale di Sviluppo della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato d'ora innanzi al "Referente Unico della Parte" di questa Regione, di provvedere ad approvare, con proprie determinazioni dirigenziali, i prossimi eventuali aggiornamenti del Piano Operativo conseguenti alle future rimodulazioni, così come previste e disciplinate dal Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) e dalla nota dall'Unità di Missione prot. 0002104-28/10/2022-UMPNRR-P, tenuto conto che tali modifiche sono oggetto di valutazione e decisione da parte del Ministero della Salute in qualità di "Amministrazione centrale titolare di intervento";

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m., ed in particolare gli artt. 23, lett. d) e 26, comma 2;
- la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria delibera n. 468/2017;
- n. 325 del 07 marzo 2022, “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
- n. 157/2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivo aggiornamento come da deliberazione n. 1453 del 1° luglio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 - 2026 - Primo Aggiornamento;
- n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;
- n. 1639 del 08/07/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 6229 del 31 marzo 2022, recante "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 7162 del 15 aprile 2022 "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto delle rimodulazioni al Piano Operativo, allegato al Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Emilia-Romagna, richieste ed accolte nell'anno 2024 dal Ministero della Salute - Ufficio I dell'Unità di Missione;
2) di approvare e di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, il Piano Operativo conseguentemente aggiornato;
3) di dare mandato al "Referente Unico della Parte" di questa Regione, di provvedere ad approvare, con proprie determinazioni dirigenziali, i prossimi eventuali aggiornamenti del Piano Operativo conseguenti alle future rimodulazioni;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della salute, Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e alla Direzione Generale della programmazione sanitaria;
5) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dal PIAO 2024/2026 e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano operativo regionale

RegioneEmilia-Romagna

Investimenti Missione 6 Salute

ALLEGATO AL CIS – REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dicembre 2024

Indice

Indice 2
1. Premesse 4
2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan 6
3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan 9
4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento 10
4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori 10
4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature 11
4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione 11
5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia Autonoma 12
6. Action Plan 13
6.1. Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona – Action Plan 13
6.2. Componente 1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan. 19
6.3. Componente 1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan 25
6.4. Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan 38
6.6 Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) 44
6.7. Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan 50
6.8. Componente 2 – Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi Art. 20 L. 67/1988) – Action Plan 54
6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Action Plan 59
6.10. Componente 2 – Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere – Action Plan 78
7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità 83
8. Equità di Accesso 85
9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali 85
10. Modalità di monitoraggio e rendicontazione 87

ALLEGATO 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio Investimenti

ALLEGATO 2 – Tabelle localizzazioni interventi

ALLEGATO 3 – Tabelle "Non arrecare danno significativo"

ALLEGATO 4 – Tabelle Schede di monitoraggio

ALLEGATO 5 – Action Plan M6C2 2.2 b – Indicazioni nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero

1. Premesse

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La *Componente 1* ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all'attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

La *Componente 2* comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per una descrizione completa degli investimenti della Missione 6 si rimanda all'Allegato 1 del presente documento.

Per i progetti a regia, per i quali le Regioni e le Provincie Autonome si configurano come soggetti attuatori, è stato ritenuto necessario intraprendere tutte le attività atte a garantire l'operatività programmatica, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, attraverso il Decreto di ripartizione programmatica delle risorse firmato dal Ministro della Salute in data 20 gennaio 2022. Il richiamato decreto ha ripartito complessivamente euro 8.042.960.665,58 suddivisi come segue tra i singoli interventi interessati:

- M6C1 1.1 "*Case della Comunità e presa in carico della persona*" per un importo di euro 2.000.000.000;
- M6C1 1.2 *"Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"* per un importo complessivo di euro 4.000.000.000 – di cui sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) per un importo di euro 280.000.000 – di cui interventi COT, Interconnessione aziendale, Device per un importo di euro 204.517.588;
- M6C1 1.3 "*Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità*" per un importo di euro 1.000.000.000;
- M6C2 1.1 "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*" (digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature – nuovi progetti e FSC) per un importo complessivo di euro 2.639.265.000;
- M6C2 1.2 "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" per un importo di euro 638.851.083,58;
- M6C2 1.3. *"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione*" - sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK….) per un importo

complessivo di euro 292.550.000 – di cui intervento Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Servizi di Cure Primarie) per un importo di euro 30.300.000;

- M6C2 2.2 (b) "*Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere*" per un importo di euro 80.026.994;
- PNC – "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" dal costo complessivo di euro 1.450.000.000.

Oltre ai suddetti interventi di investimento, per le finalità attuative del PNRR, è stato ritenuto opportuno includere nel Piano operativo anche i seguenti:

- M6C2 1.1 "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*" (Rafforzamento strutturale del SSN) – progetti in essere per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;
- M6C2 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) per un importo complessivo di euro 1.379.989.999,93 – di cui intervento "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" per un importo di euro 610.390.000;
- M6C2 2.2 (a) "*Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale*" per un importo di euro 101.973.006,00.

Il presente Piano Operativo della Regione Emilia-Romagna si inserisce, pertanto, in via generale, nell'ambito del decreto di ripartizione sopra richiamato. Il Piano Operativo, comprensivo dell'Action Plan, uno per ciascun investimento per il quale la Regione si configura come soggetto attuatore, costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

2. Descrizione Piano Operativo e Action Plan

Il presente Piano Operativo si compone degli Action Plan redatti dalla Regione Emilia-Romagna per ciascuna Linea di investimento, dettagliati degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e per i quali la Regione/Provincia Autonoma predispone apposite *"scheda intervento"*, per le quali si rimanda al paragrafo 4.

La tabella che segue illustra per ciascun investimento di cui la Regione/Provincia Autonoma si configura quale soggetto attuatore (*articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo*):

- il dettaglio dei macro-target nazionali, che rappresentano l'obiettivo minimo complessivo a livello nazionale dell'investimento, soggetto al monitoraggio da parte dell'Organismo competente nazionale o europeo;
- i termini di esecuzione regionali;
- le risorse economiche assegnate a livello nazionale per ciascun investimento.

Tabella 1 - Dettaglio Target massimo, termine di esecuzione e risorse assegnate per investimento/sub-investimento

Riferimento Missione e Componente	Codifica Decreto MEF_06/08/2021	Riferimenti Investimenti	Macro target nazionale	Termine esecuzione regionale	Totale Risorse [€]
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina					**3.204.517.588**
M6C1	**1.1**	**Case della Comunità e presa in carico della persona**	**1350**	**T1 2026**	**2.000.000.000**
	1.2	**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**			**204.517.588**
	1.2.2	Centrali operative territoriali (COT)	600	T1 2024	204.517.588
		di cui COT	*600*	*T1 2024*	*103.845.000*
		di cui: interconnessione aziendale	*N/A*	*T1 2024*	*42.642.875*
		di cui: device	*N/A*	*T1 2024*	*58.029.713*
	1.3	**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**	**400**	**T1 2026**	**1.000.000.000**
PNRR - Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria					**5.513.951.084**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**			**4.052.410.000**
	1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	280	T3 2025	1.450.110.000
		Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Rafforzamento strutturale del SSN) - progetti in essere	N/A	T2 2026	1.413.145.000
	1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apprecchiature)	3100	T4 2024	1.189.155.000
	1.2	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**109**	**T2 2026**	**638.851.084**
	1.3.1	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni"**	**N/A**	**T2 2026**	**610.390.000**
	1.3.2	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK....)**	**4**	**T1 2025**	**30.300.000**
	2.2	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario**			**182.000.000**
	2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale	2700	T2 2024	101.973.006
	2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	293.386	T2 2026	80.026.994
Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)					**1.450.000.000**
	2	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**220**	**T2 2026**	**1.450.000.000**
TOTALE					**10.168.468.672**

Il Piano Operativo è articolato in Action Plan per ciascuna delle Linee di Investimento della Missione 6 "Salute" di cui le Regioni/Province Autonome sono soggetti attuatori.

2.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - 3.4.1 Obblighi di comunicazione a livello di progetto

Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono ripotare l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i soggetti attuatori dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento);

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. FOCUS) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"

3. Linee guida alla compilazione degli Action Plan

Gli Action Plan relativi a ciascuna linea d'investimento sono redatti dalla Regione Emilia-Romagna tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

OBIETTIVO PNRR o PNC	Sezione precompilata [da non modificare]
INDICATORI COMUNI	Sezione precompilata [da non modificare]
INDICAZIONI OPERATIVE	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: • le eventuali ulteriori azioni che la Regione o PP.AA. intende intraprendere ai fini dell'attuazione dell'investimento; • le specifiche relative alle eventuali procedure aggregate di affidamento di cui la Regione o PP.AA. si serve al fine di rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Istituzionale di Sviluppo.
OBIETTIVI REGIONALI	Sezione parzialmente precompilata da integrare indicando: • Target massimo regionale; • Fabbisogno.
CRONOPROGRAMMA	Sezione precompilata [da non modificare]
RIFERIMENTI NORMATIVI	Sezione da compilare indicando i riferimenti normativi relativi all'ambito di investimento.
DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"	Sezione precompilata contenente il Dettaglio dell'eventuale quota assegnata (tag) alla dimensione "green" e "digital" per ciascun investimento, secondo le percentuali stabilite dalle linee guida comunitarie.
DO NO SIGNIFICANT HARM	Sezione precompilata con la valutazione degli investimenti rispetto al principio di "*non arrecare un danno significativo*" all'ambiente.

4. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento

Le Schede Intervento devono essere redatte per ogni singolo intervento dalla Regione Emilia-Romagna utilizzando, a seconda della tipologia di intervento oggetto della scheda (lavori/grandi apparecchiature/digitalizzazione), uno dei tre schemi presenti nel portale messo a disposizione da AGENAS e tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate:

4.1. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento lavori

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, Investimento PNRR, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la tipologia di intervento (i dati dimensionali del singolo intervento in termini di superfici lorde); • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento; • le procedure in materia ambientale, archeologica, etc.; • gli elementi progettuali e stato di attuazione attuale/previsto; • il cronoprogramma; • il quadro economico dei lavori.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; • il cronoprogramma finanziario.
SEZIONE IV: DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE	La presente sezione deve essere compilata specificando i dati generali e i dati dimensionali/patrimoniali dell'immobile.

4.2. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento grandi apparecchiature

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Descrizione apparecchiatura, Importo complessivo, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • tipologia di intervento; • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • il cronoprogramma; • il quadro del fabbisogno di spesa.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; il cronoprogramma finanziario.

4.3. Linee guida alla compilazione delle Schede Intervento digitalizzazione

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la Regione/Provincia Autonoma di riferimento e gli elementi identificativi del soggetto richiedente (Ente del SSN); • l'intervento comprensivo di tutti gli elementi identificativi (titolo intervento, CUP/Codice Progetto, Importo complessivo, etc.).
SEZIONE II: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	La presente sezione deve essere compilata specificando: • la dichiarazione di coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PNRR; • la dichiarazione di coerenza con gli obiettivi specifici della missione dell'intervento; • l'inquadramento programmatico; • gli aspetti giuridico – amministrativi relativi all'appaltabilità dell'intervento; • il cronoprogramma; • il quadro economico dei lavori.
SEZIONE III: DATI ECONOMICI, FINANZIARI	La presente sezione deve essere compilata specificando: • le fonti di finanziamento del progetto; • il cronoprogramma finanziario.

5. Attuazione impegni previsti per la Regione/Provincia Autonoma

La Regione/Provincia Autonoma procede a dare attuazione agli impegni previsti per il soggetto attuatore dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare in riferimento a quanto previsto all'articolo 5 dello stesso, secondo quanto riportato nella tabella di seguito:

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL CIS	
DELEGA DEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE AGLI ENTI DEL SSR – SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO (cfr. art. 5 comma 2 CIS)	Aziende ed Enti del SSR delegati ai sensi delle delibere di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 71/2022 e n. 1076/2022: ▪ Azienda USL di Piacenza ▪ Azienda USL di Parma ▪ Azienda USL di Reggio Emilia ▪ Azienda USL di Modena ▪ Azienda USL di Bologna ▪ Azienda USL di Imola ▪ Azienda USL di Ferrara ▪ Azienda USL della Romagna ▪ Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ▪ Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ▪ Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS ▪ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli ▪ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
RICORSO A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AGGREGATE (cfr. art. 5 comma 3 CIS)	▪ Sì. ▪ La Regione Emilia-Romagna si impegna ad individuare le soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi nei tempi previsti, assicurando presidi di trasparenza e legalità attraverso, ove possibile, il ricorso a procedure di affidamento aggregate, anche avvalendosi di Centrali di Committenza individuate dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Action Plan

6.1. Componente 1 - Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona - Action Plan

C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	1.350 case della comunità
TARGET MASSIMO	Definito a livello nazionale
DESCRIZIONE CID	Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1.350 Case della Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di base e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta integrata alle esigenze di assistenza.
REQUISITI CID TARGET M6 C1 3	Almeno 1.350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	▪ Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- La Regione/Provincia Autonoma ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e dei siti idonei alla realizzazione delle Case della Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021.
- La Regione/Provincia Autonoma procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio delle Case della Comunità.
- La Regione/Provincia Autonoma procede a verificare che i singoli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle Case della Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef.
- La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.).
- Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	84
TARGET MASSIMO REGIONALE	85

FABBISOGNO

Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Case della Comunità da edificare	Numero Case della Comunità da ristrutturare comprensivi degli ampliamenti	Totale
Azienda USL di Piacenza	*2*	*4*	*6*
Azienda USL di Parma	*5*	*4*	*9*
Azienda USL Reggio Emilia	*3*	*7*	*10*
Azienda USL di Modena	*4*	*9*	*13*
Azienda USL di Bologna	*3*	*14*	*17*
Azienda USL di Imola	*0*	*3*	*3*
Azienda USL di Ferrara	*0*	*6*	*6*
Azienda USL della Romagna	*7*	*14*	*21*
Totale	*24*	*61*	*85*

La Regione Emilia-Romagna, oltre alle 84 Case della Comunità, la cui realizzazione è programmata con Fondi PNRR, realizzerà una ulteriore nuova Casa della Comunità, a Monchio delle Corti (PR), finanziata interamente con fondi regionali.

In relazione nr. 4 Case della Comunità, sono previsti:

- un cofinanziamento del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) di € 450.000,00, di cui € 300.000,00 approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 186/2021 e Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2022 ed € 150.000,00 approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 220/2022 e Delibera del Consiglio Comunale n. 75/2022; l'allegato 2 riporta tale complessivo importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi);
- un cofinanziamento del Comune di Bologna di € 1.612.654,36, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53/2022 e Delibera del Consiglio Comunale n. 8/2023; l'allegato 2 riporta tale importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi);
- un cofinanziamento dell'Ausl della Romagna di € 502.339,43, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 30.03.2023; l'allegato 2 riporta tale importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi);
- un cofinanziamento del Comune di Monchio delle Corti (PR) di € 180.000,00, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2023; l'allegato 2 riporta tale complessivo importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

In relazione a nr. 64 Case della Comunità, con i Decreti MEF-RGS n. 52 del 2.3.2023, n. ID 25491 del 28.03.23 e n. 185 dell'8.08.23 sono state assegnate risorse inerenti al Fondo opere indifferibili 2022 e 2023 per complessivi € 29.700.297,02. l'allegato 2 riporta i singoli importi nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 124.671.950,69

Importo integrativo a carico del bilancio regionale: € 1.386.596,87 - Cap U51636 del Bilancio di Previsione 2020-2022 (DGR 1112 del 12/07/2021)

Importo aggiuntivo a carico del Comune di Sorbolo Mezzani (PR): € 450.000

Importo aggiuntivo a carico del Comune di Bologna: € 1.612.654,36

Importo aggiuntivo a carico dell'Ausl della Romagna: € 502.339,43

Importo aggiuntivo a carico del Comune di Monchio delle Corti: € 180.000

Importi Fondo Opere Indifferibili 2022 e 2023: € 29.700.297,02

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte)	T1 2023	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità	T3 2023	
Target	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*

- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota risorse assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.1**	**Case della Comunità e presa in carico della persona**	**124.671.950,69**	**60%** (74.752.806,01)	025 ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico	40%			29.901.122,40	
				40% (49.919.144,68)	026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40%			19.967.657,87	
			Totale	**100%**						

La Regione/Provincia Autonoma si impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare che le risorse siano destinate ad investimenti di cui ai seguenti tag 025 ter e 026 indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1 è riportato nella tabella 5 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano nonché quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.2. Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Action Plan

C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**600** COT
TARGET MASSIMO	**Definito a livello nazionale**
DESCRIZIONE CID	L'investimento previsto riguarda l'attivazione di 602 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.
REQUISITI CID TARGET M6 C1 7	Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE	
MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione delle COT, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per la realizzazione delle COT. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo delle COT definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'investimento in oggetto. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	45
TARGET MASSIMO REGIONALE	45
FABBISOGNO	Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numero di COT, dettagliato per Ente del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascuna COT è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

AZIENDA	Sede COT
Azienda USL di Piacenza	Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Cortemaggiore
Azienda USL di Parma	Parma, Parma -Pablo, Sala Baganza, Fidenza-Vaio, Borgo Val di Taro
Azienda USL di Reggio Emilia	Reggio Emilia, Correggio, Guastalla, San Polo d'Enza, Castelnovo ne' Monti
Azienda USL di Modena	Finale Emilia, Carpi, Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Sassuolo
Azienda USL di Bologna	Bologna, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Casalecchio di Reno, Alto Reno Terme
Azienda USL di Imola	Imola
Azienda USL di Ferrara	Ferrara, Bondeno, Argenta, Comacchio
Azienda USL della Romagna	Ravenna, Forlì, Santa Sofia, Cesenatico, Savignano, Cesena, Rimini, Novafeltria, Lugo, Faenza, Riccione
Totale	*45*

In relazione a nr. 12 Centrali operative territoriali, con i Decreti MEF-RGS n. 52 del 2.3.2023, n. ID 25491 del 28.03.2023 e n. 185 dell'8.08.23 sono state assegnate risorse inerenti al Fondo opere indifferibili 2022 e 2023 per complessivi € 420.841,15; l'allegato 2 riporta i singoli importi nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

IMPORTO ASSEGNATO

- Importo assegnato alla Regione dal PNRR - risorse COT: € 7.788.375,00
- Importo assegnato alla Regione dal PNRR- risorse interconnessione aziendale: € 3.198.215,63
- Importo assegnato alla Regione dal PNRR - risorse device: € 4.352.064.52
- Importi Fondo Opere Indifferibili: € 420.841,15

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2022	
Target	Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale	T2 2022	
Target	Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T4 2022	
Target	Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale	T4 2022	
Target	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali	T2 2023	
Target	Stipula dei contratti per l'interconnessione aziendale	T2 2023	
Target	Centrali operative pienamente funzionanti	T1 2024	
Target	Completamento interventi per interconnessione aziendale	T1 2024	

GANTT

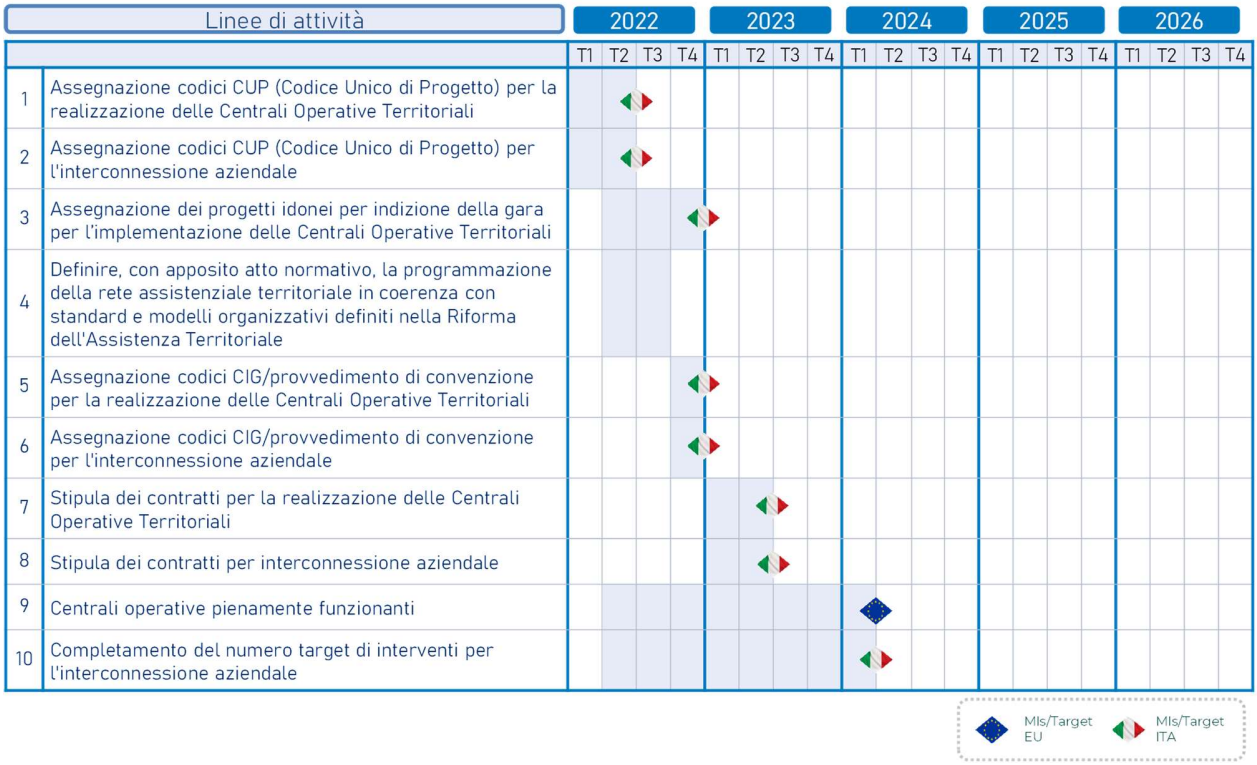

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6 C1	**1.2**	**Casa come primo luogo di cura e telemedicina**			013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0 %	013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	100 %		7.550.444,11
	1.2.2	**Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)**	**15.338.819,11**	**15.338.819,11**						
		di cui: COT	**7.788.375,00**	**7.788.375,00**						
		di cui: interconnessione aziendale	**3.198.215,63**	**3.198.215,63**						
		di cui: device	**4.352.228,48**	**4.352.228,48**						

La Regione/Provincia Autonoma s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Tale Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 6 dell'Allegato 3 di cui al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";

- scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”;
- scheda 9 “Acquisto di veicoli”.

6.3. Componente 1 - Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – Action Plan

C1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**400** Ospedali di Comunità
TARGET MASSIMO	**Definito a livello nazionale**
DESCRIZIONE CID	L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 400 Ospedali di Comunità,
REQUISITI CID TARGET M6 C1 11	Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
12. Capacità delle strutture di assistenza sanitarie nuove o modernizzate	▪ Numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell’arco di un anno da una struttura sanitaria o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell’ambito del dispositivo	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha concluso nel 2021 l'attività di ricognizione delle localizzazioni e siti idonei alla realizzazione degli Ospedali di Comunità, come previsto dalle scadenze PNRR, e ha proceduto con l'individuazione dei siti idonei a dicembre 2021. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad effettuare una ricognizione degli interventi necessari ai fini dell'indizione delle gare per l'attivazione e avvio degli Ospedali di Comunità. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede a verificare che i singoli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) monitorino l'aderenza ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal modello organizzativo degli Ospedali di Comunità definito dal Ministero della salute di concerto con il Mef. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento all'ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di approvvigionamento aggregato.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE	27
TARGET MASSIMO REGIONALE	27
FABBISOGNO	Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti fra da edificare e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun Ospedale di Comunità è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

Ente del SSR	Numero Ospedali di Comunità da edificare	Numero Ospedali di Comunità da riconvertire	Totale
Azienda USL di Piacenza	1	1	2
Azienda USL di Parma	3	0	3
Azienda USL di Reggio Emilia	1	2	3
Azienda USL di Modena	3	1	4
Azienda USL di Bologna	1	4	5
Azienda USL di Imola	0	1	1
Azienda USL di Ferrara	0	2	2
Azienda USL della Romagna	4	3	7
Totale	13	14	27

In relazione a nr. 2 Ospedali di Comunità sono previsti:

-un cofinanziamento dell'Ausl della Romagna di € 1.525.419,80, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 30.03.2023; l'allegato 2 riporta tale importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi);

-un cofinanziamento dell'Ausl di Parma di € 15.152,63, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 31.03.2023; l'allegato 2 riporta tale importo nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

In relazione a nr. 24 Ospedali di comunità, con il Decreto MEF-RGS n. 52 del 2.3.2023 sono state assegnate risorse inerenti al Fondo opere indifferibili 2022 per complessivi € 13.544.145,19; l'allegato 2 riporta i singoli importi nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 68.002.882,19 Importo integrative Ausl della Romagna: € 1.525.419,80 Importo integrative Ausl di Parma: € 15.152,63 Importi Fondo Opere Indifferibili: € 13.544.145,19

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T2 2022	
Target	Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T1 2023	
Target	Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	T3 2023	
Target	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T1 2026	

GANTT

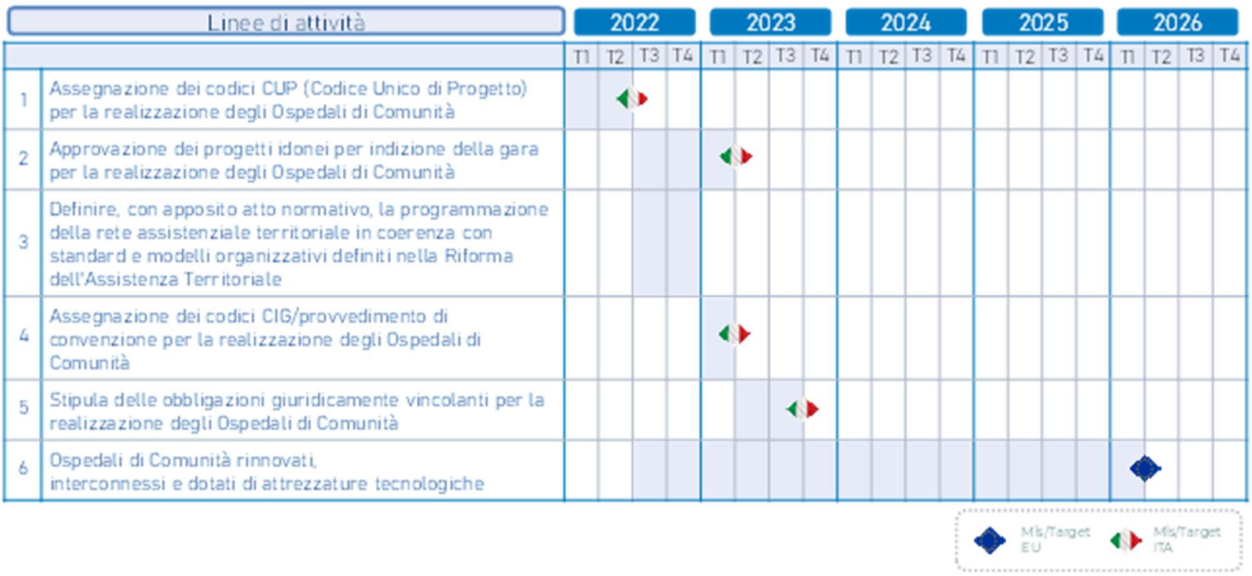

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C1	**1.3**	**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**	**68.002.882,19**	**68.002.882,19**	092 - Infrastrutture per la sanità	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 7 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici".

Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	**280 Ospedali sede di DEA I e II Livello digitalizzati**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 8	Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha individuato il numero di interventi di digitalizzazione di strutture sanitarie sede di DEA I e II livello per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali), al fine di raggiungere il numero target complessivo. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento, come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a dicembre 2021 con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ La Regione/Provincia Autonoma e gli Enti del SSR ricorrono ad accordi quadro conclusi con Consip
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con

quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.

- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE 19

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di struttura (DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Titolo Progetto	Presidio ospedaliero	DEA I o II Livello	Comune
Azienda USL di Piacenza	Digitalizzazione del DEA di I e II Livello per Ospedale "Guglielmo da Saliceto" Piacenza	OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO"	DEA 1	PIACENZA
Azienda USL di Parma	Digitalizzazione del DEA di I livello	OSPEDALE FIDENZA	DEA 1	FIDENZA
Azienda USL di Reggio Emilia	Digitalizzazione DEA II livello: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	DEA 2	REGGIO NELL'EMILIA
Azienda USL di Modena	Digitalizzazione del DEA I Livello	OSPEDALE "B. RAMAZZINI"	DEA 1	CARPI
Azienda USL di Bologna	Digitalizzazione DEA I e DEA II Livello: Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna	OSPEDALE MAGGIORE "C.A. PIZZARDI"	DEA 2	BOLOGNA
Azienda USL di Imola	Digitalizzazione DEA I Livello: Ospedale Civile Nuovo "Santa Maria della Scaletta" di Imola	OSPEDALE CIVILE NUOVO "S. MARIA DELLA SCALETTA	DEA 1	IMOLA
Azienda USL di Ferrara	Digitalizzazione DEA I e DEA II Livello: Ospedale del Delta di Lagosanto	OSPEDALE DEL DELTA	DEA 1	LAGOSANTO
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna DEA II Livello	OSPEDALE "SANTA MARIA DELLE CROCI"	DEA 2	RAVENNA

Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì DEA II Livello	OSPEDALE "MORGAGNI-PIERANTONI"	DEA 2	FORLI'
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena DEA II Livello	OSPEDALE "MAURIZIO BUFALINI"	DEA 2	CESENA
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Infermi" di Rimini DEA II Livello	OSPEDALE "INFERMI"	DEA 2	RIMINI
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Umberto I" di Lugo DEA I Livello	OSPEDALE "UMBERTO 1°"	DEA 1	LUGO
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Degli Infermi" di Faenza DEA I Livello	OSPEDALE "DEGLI INFERMI "	DEA 1	FAENZA
Azienda USL della Romagna	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione DEA I Livello	OSPEDALE "CECCARINI"	DEA 1	RICCIONE
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Digitalizzazione del DEA di II livello	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	DEA 2	PARMA
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Digitalizzazione del DEA II livello: Ospedale Policlinico di Modena	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	DEA 2	MODENA
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Digitalizzazione del DEA II livello: Ospedale Civile di Baggiovara	NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE	DEA 2	MODENA
IRCCS Policlinico Sant'Orsola Bologna	Sviluppo del Sistema Informativo dell'Ospedale DEA II Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna DEA II Livello	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	DEA 2	BOLOGNA
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Digitalizzazione DEA I e II Livello: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Ospedale di Cona	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA	DEA 2	FERRARA
Totale (n. progetti)	19			

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

IMPORTO ASSEGNATO Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 98.611.659,50

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*).	T4 2022	
Target	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione -Livello I e II)	T3 2025	

(*) La milestone è relativa alle gare Consip

GANTT

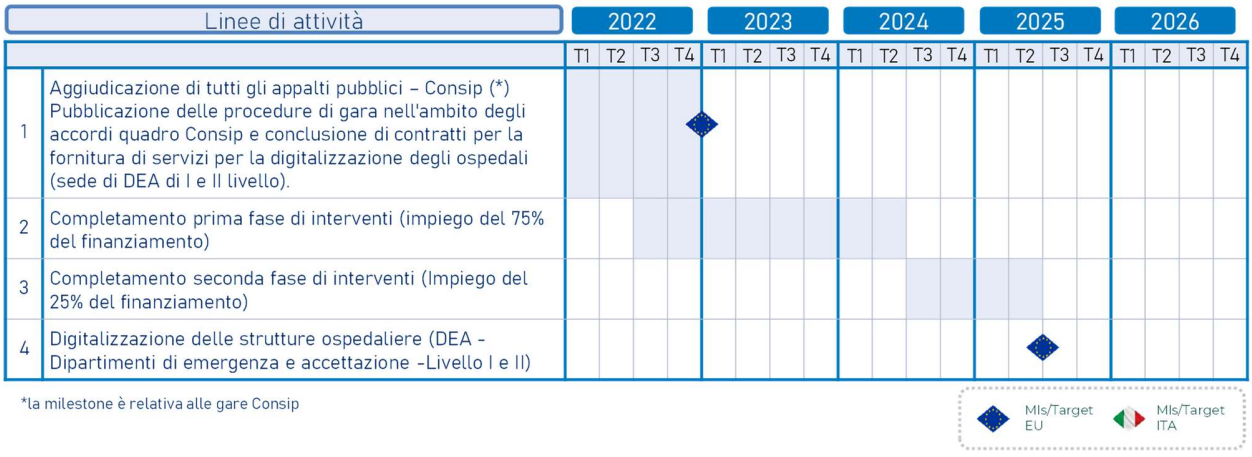

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*

- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.1.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**								
	1.1.1	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)**	**98.611.659,50**	**98.611.659,50**	093 - Attrezzature sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100 %	-	**98.611.659,50**

La Regione/Provincia Autonoma s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.1 è riportato nella Tabella 8 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche"
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.4. Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie – Action Plan

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**3.100** grandi apparecchiature sanitarie
TARGET MASSIMO	**Definito a livello nazionale**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce all'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 6	In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE	
MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha individuato il numero di grandi apparecchiature sanitarie da sostituire per ciascun Ente del Servizio sanitario regionale (SSR) e le modalità di approvvigionamento (gare Consip/regionali/aziendali) entro Gennaio 2022, al fine di raggiungere il numero target complessivo. ▪ Sono ammissibili a finanziamento PNRR tutte le apparecchiature, previste dal PNRR, le cui procedure di gara sono iniziate dopo il 1° febbraio 2020. Si precisa che, come previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, "sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Regolamento", purché la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti con quanto previsto nell'ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al

	presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ […]
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti n coerenza con la circolare 4 del 18 gennaio del MEF. ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE 239

TARGET MASSIMO REGIONALE 239

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numerosità di apparecchiature, dettagliato per tipologia e per Ente del SSR. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.	Totale
Azienda USL Piacenza	4	1		3	1		2				11
Azienda USL Parma	1			7			1				9
Azienda USL Reggio Emilia	3	2		12	1		9			2	29
Azienda USL Modena	1	2		14			2			4	23
Azienda USL Bologna	5			16	2		4			9	36
Azienda USL Imola				4			1			16	21
Azienda USL Ferrara		1		3			3			6	13
Azienda AUSL Romagna	6	3	1	8		1	9	3		2	33
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	2	1		7	3			2			15
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	3		1	14	3		2			2	25
IRCCS Policlinico Sant'Orsola Bologna	1	1			3		2		2	2	11

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli		1		2							3
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara		1		2	2		1	1		3	10
Totale	**26**	**13**	**2**	**92**	**15**	**1**	**36**	**6**	**2**	**46**	**239**

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 80.865.967,38

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PER TIPOLOGIA

Regione	TAC	RMN	ACC. LIN.	SIST. RAD.	ANG.	G.C.	MAMM.	G.C./TAC	PET/TAC	ECOT.
Numero Apparecchiature	26	13	2	92	15	1	36	6	2	46
Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip			2	92					2	46
Acquisizione tramite iniziativa centralizzata Consip già attiva										
Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura già espletata										
Procedura di gara autonoma per l'affidamento della fornitura da espletare	26	13			15	1	36	6		

TAC: Tomografia Assiale Computerizzata a 128 strati; RMN: Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 T; Acc. Lin: Acceleratori Lineari; Sis. Rad.: Sistema Radiologico Fisso; ANG.: Angiografi; G.C.: Gamma Camera; Mamm.: Mammografi; PET: Tomografia a emissione di positroni; Ecot.: Ecotomografi.

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature	T4 2022	
Target	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	T4 2024	

GANTT

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.1.2.

(tabella non modificabile da regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR -Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.1**	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero**								
	1.1.2	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)**	**80.865.967,38**	**80.865.967,38**	093 - Attrezzature sanitarie	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.1.2 è riportato è riportato nella tabella 8 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa

corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.6 Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

C2 – 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**7.700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva (3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva)**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 9	La dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE POSTI LETTO

Regione	Totale risorse assegnate	P.L. Terapia Intensiva autorizzati da MdS	P.L. Terapia Semi - Intensiva autorizzati da MdS
Piemonte	111.222.717 €	299	305
Valle d'Aosta	3.038.688 €	10	9
Lombardia	225.345.817 €	585	704
PA di Bolzano	14.344.710 €	40	37
PA di Trento	16.269.428 €	46	38
Veneto	101.544.271 €	211	343
Friuli Venezia Giulia	25.703.911 €	55	85
Liguria	28.893.350 €	87	118
Emilia Romagna	95.040.697 €	197	312
Toscana	79.367.367 €	193	261
Umbria	24.180.508 €	58	62
Marche	39.790.608 €	105	107
Lazio	118.561.444 €	282	412
Abruzzo	29.047.242 €	66	92
Molise	6.970.569 €	14	21
Campania	163.813.544 €	499	406
Puglia	99.866.963 €	276	285
Basilicata	13.545.322 €	32	40
Calabria	51.171.973 €	134	136
Sicilia	123.309.660 €	301	350
Sardegna	42.116.211 €	101	115
Totale	**1.413.145.000 €**	**3.591**	**4.238**

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ Il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. ▪ Le risorse sono altresì finalizzate al rafforzamento strutturale degli ospedali SSN, attraverso un piano di riorganizzazione al fine di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche (rinnovare e ristrutturare 651 strutture tra PS, DEA, strutture di supporto ospedaliero e territoriale). ▪ La Regione/Provincia Autonoma ha approvato il Piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive con specifici atti : DGR 617 del 15 giugno 2020 , DGR n. 869 del 17 luglio 2020 e DGR n. 1705 del 23 novembre 2020 . Il Piano di riorganizzazione è volto a garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del DL 34/2020. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad aggiornare tempestivamente il Piano di riorganizzazione già approvato, in funzione di eventuali sopraggiunte rimodulazioni. ▪ La Regione/Provincia Autonoma e gli enti del SSR hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere in parte all'utilizzo degli Accordi Quadro relativi alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020" espletata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed alle procedure di acquisto centralizzate espletate dal medesimo Commissario per l'acquisto di tecnologie biomediche e autoambulanze.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento. ▪ Nel caso in cui si evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	197 PL Terapia Intensiva 312 PL Terapia Sub-Intensiva 47 Interventi di ristrutturazione dei percorsi PS
IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR (DL 34/2020): € 92.777.224,00 Importo integrativo a carico del Bilancio regionale: ☐ € 195.771,21 (Delibera Giunta regionale n. 617/2020) ☐ € 6.938.785,53 (Delibera Giunta regionale n. 1705/2020)

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	45% dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva	T4 2024	
Target	45% degli interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T4 2024	
Target	7700 Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva	T2 2026	
Target	Ospedali digitalizzati (DEA - Dipartimenti di Emergenza e di Ammissione - Livello I e II) – 651 interventi di ristrutturazione dei percorsi PS	T2 2026	

GANTT

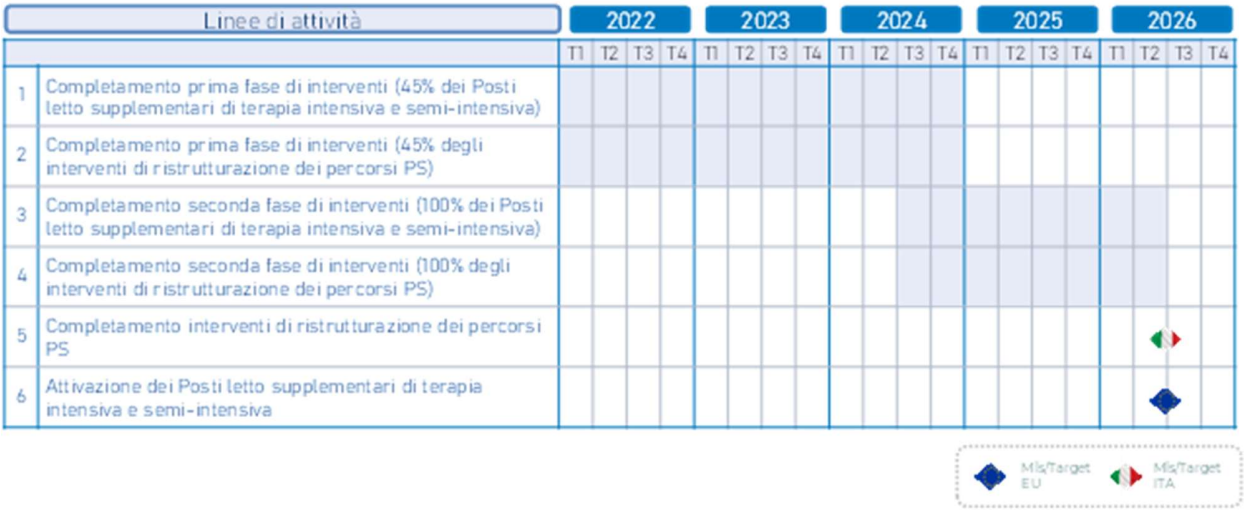

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);*
- *DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 e Piano di riorganizzazione di Riorganizzazione e rafforzamento Terapie Intensive e Semi Intensive (allegato al Decreto direttoriale);*
- *Delibera della Giunta regionale n. 677 del 15 giugno 2020 "Emergenza pandemica COVID-19 - Disposizioni in ordine al piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera di cui all' art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 869 del 17 luglio 2020 "Approvazione Piano di riorganizzazione ex art 2, dl 19 maggio 2020, n.34 per i ricoveri in regime di terapia e in aree di assistenza ad alta intensità di cura - Tabella 2: posti letto terapia intensiva e semintensiva e Tabella 3: adeguamento funzionale pronto soccorso "*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1705 del 23 novembre 2020 "Piano regionale di riorganizzazione rete ospedaliera regionale. Approvazione Tabelle aggiornate degli interventi di realizzazione posti letto terapia intensiva, terapia semintensiva, area critica/medica, pronto soccorso, piano dei costi e relativi quadri finanziari"*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

DO NO SIGNIFICANT HARM

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH.

Nello specifico, le schede di riferimento, previste all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

6.7. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	**109** interventi strutturali
TARGET MASSIMO	**Definito a livello nazionale**
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche. L'investimento si riferisce in particolare agli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni
REQUISITI CID TARGET M6 C2 10	Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione - allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento al presente investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ La Regione/Provincia Autonoma e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo) che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: Centrale di committenza Intercenter – Bando ai sensi della DD di Intercenter n. 92 del 24 febbraio 2022
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di

investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.

- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato da PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET MINIMO REGIONALE 4

TARGET MASSIMO REGIONALE 7

FABBISOGNO

Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Dati immobile		Interventi	
	Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello attuazione
Azienda USL di Reggio Emilia (Ospedale di Guastalla corpo C)	2.035 (miglioramento sismico)	13	3	Avvio lavori
Azienda USL di Bologna (Ospedale Bellaria Pad. C)	5.162 (miglioramento sismico)	44	3	Avvio lavori
Azienda USL di Imola	560 (miglioramento sismico)	0	2	Avvio lavori
Azienda USL di Reggio Emilia (Ospedale di Guastalla – corpo A1)	3.759 (miglioramento sismico) 167 (ampliamento)	72	3	Avvio lavori
Azienda USL di Reggio Emilia (Ospedale di Castelnovo Ne' Monti)	3.830 (miglioramento sismico) 100 (ampliamento)	39	2	Avvio lavori
IRCCS Policlinico Sant'Orsola Bologna (Pad. 26)	3.090 (demolizione) 3.780 (nuova costruzione)	0	3	Avvio lavori
Azienda USL della Romagna (interventi puntuali nei presidi ospedalieri di Ravenna, Lugo e Rimini)	20.462 (miglioramento/adeguamento sismico)	132	2 e 3	Avvio lavori

Con il Decreto MEF-RGS n. 52 del 2.3.2023 sono state assegnate risorse inerenti al Fondo opere indifferibili 2022 per complessivi € 8.172.454,80 €; l'allegato 2 riporta i singoli importi nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 43.443.714,98
Importi Fondo Opere Indifferibili: € 8.172.454,80

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Pubblicazione procedure di gara per interventi antisismici	T1 2023	
Target	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture	T2 2026	

GANTT

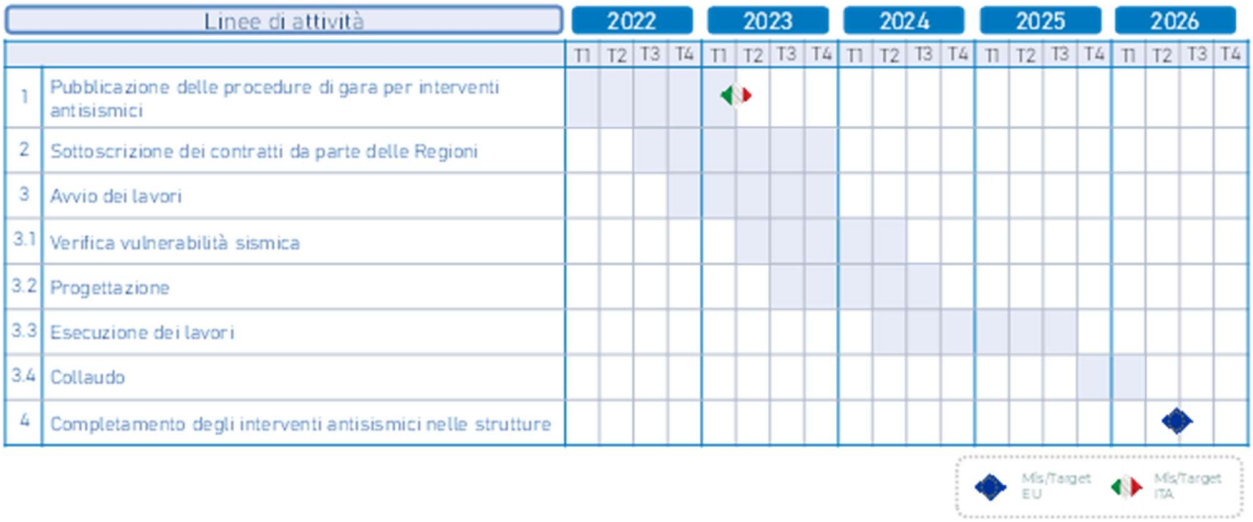

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 1.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Innovazione, ricerca digitalizzazione dell'assistenza sanitaria									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.2**	**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**	**43.443.714,98**	**0**	092 - Infrastrutture per la sanità	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro

piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";
- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario".

6.8. Componente 2 - Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi Art. 20 L. 67/1988) – Action Plan

C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (ex PNC) Fondi Art. 20 L. 67/1988, come previsto dall'art. 1, comma 13, DL 19/2024

OBIETTIVO PNC	
TARGET NAZIONALE	**220** interventi strutturali
DESCRIZIONE DECRETO MEF DEL 15/07/2021	Adattare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo Complementare.
RISULTATI FINALI	Completamento di 220 interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri in ottica di adeguamento alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica.

Ciascuna regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma ha effettuato una puntuale ricognizione degli interventi di adeguamento strutturale, individuando per ciascun intervento la fase progettuale prevista per anno, entro gennaio 2022. ▪ La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento come risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno con riferimento all'ambito di investimento. Tali schede riportano le informazioni qualificanti l'intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). ▪ La Regione/Provincia Autonoma e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo) che, qualora già disponibili, si dettagliano: Centrale di committenza Intercenter – Bando ai sensi della DD di Intercenter n. 92 del 24 febbraio 2022 .
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 ▪ Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNC assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNC ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNC che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNC.

OBIETTIVI REGIONALI

OBIETTIVO REGIONALE	**7**
FABBISOGNO	Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numerosità di interventi, dettagliato per Ente del SSR e per stato di avanzamento del progetto. Il dettaglio delle localizzazioni di ciascun intervento è riportato nell'Allegato 2 del presente Piano.

ENTE del SSR	Dati immobile		Interventi	
	Superficie	Posti letto	Cat. Zona sismica	Livello attuazione
Azienda USL della Romagna (Ospedale di Forlì)	700 (demolizione) 3.178 (nuova costruzione)	29	2	Avvio lavori
Azienda USL della Romagna (Ospedale di Rimini)	1.600 (demolizione) 8.990 (nuova costruzione)	160	2	Avvio lavori
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	7.217 (demolizione) 9.900 (nuova costruzione)	49	3	Avvio lavori
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	16.528 (demolizione) 4.329 (nuova costruzione)	0	3	Avvio lavori
IRCCS Policlinico Sant'Orsola Bologna (Pad. 3)	2.070 (miglioramento sismico)	0	3	Avvio lavori
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli	34.422 (miglioramento sismico)	293	3	Avvio lavori
Azienda USL di Ferrara (Ospedale di Argenta)	2.270 (demolizione) 4.550 (nuova costruzione) 600 (ristrutturazione)	52	2	Avvio lavori

In relazione a nr. 6 interventi, con i Decreti MEF-RGS n. 52 del 2.3.2023 e n. 187 dell'11.08.2023 sono state assegnate risorse inerenti al Fondo opere indifferibili 2022 e 2023 per complessivi € 39.542.370,28: l'allegato 2 riporta i singoli importi nella colonna IMPORTO INTERVENTO (Altri fondi).

IMPORTO ASSEGNATO

Importo assegnato alla Regione da Art. 20 L. 67/1988 ex PNC: € 98.604.179,18
Importi Fondo Opere Indifferibili: € 39.542.370,28. Fondi Aziendali: € 9.176,14

CRONOPROGRAMMA

Saranno rispettate le tempistiche previste per gli interventi finanziati con fondi ex Art. 20 L. 67/1988

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Delibera della Giunta regionale n. 71 del 24 gennaio 2022 "PNRR Missione 6 Salute – Primi provvedimenti organizzativi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 219 del 21 febbraio 2022 "PNRR Missione 6 Salute - Assegnazione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR delle risorse per la realizzazione degli investimenti ed approvazione dei relativi interventi"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 811 del 23 maggio 2022 "PNRR Missione 6 Salute Componete 1 e 2: aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale"*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1076 del 27 giugno 2022 "PNRR Missione 6 Salute: approvazione del format di delega alle Aziende ed Enti del SSR in attuazione dell'art. 5, comma 2, del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS)"*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Non applicabile alla linea d'intervento di carattere nazionale.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.2 è riportato nella tabella 9 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 1 "Costruzione di nuovi edifici";
- scheda 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali";

- scheda 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- scheda 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”.

6.9. Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" – Action Plan

C2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome"

OBIETTIVO PNRR	
TARGET EU	**85%** dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico **21** Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
DESCRIZIONE CID	Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di seguito descritti. 1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio nazionale. 2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del Ministero della Salute italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi seguenti integrati tra loro: i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "*One-Health*" per monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la reingegnerizzazione e la standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di dati, al fine di ottimizzare lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possano incontrarsi.

DESCRIZIONE SUB LINEA DI INTERVENTO OGGETTO DELL'ACTION PLAN	L'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone delle seguenti linee di attività relative a: a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly; b) adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome; c) utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Tessera Sanitaria Elettronica, e che quest'ultima si riferisce a progetti già in essere. In particolare, il presente Action Plan si riferisce al sub-intervento 1.3.1 (b) Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province autonome, il cui Soggetto attuatore, con facoltà di sub-delega in favore delle Regioni, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 13	Tutte le Regioni/Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE. In particolare il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore delle strutture sanitarie, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 11	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.

Ciascuna Regione/Provincia autonoma contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati – per l'intervento FSE.	▪ Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo.	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- È prevista l'attivazione delle procedure per la realizzazione dell'archivio centrale (Repository centrale) - Fascicolo sanitario elettronico (FSE), da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale).
- È prevista l'attivazione delle attività per il supporto organizzativo, manageriale, strategico, tematico e la formazione a livello regionale e locale, da parte del Soggetto Attuatore (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale).
- È prevista la realizzazione, implementazione e messa in funzione di un registro centrale per i documenti digitali e di una piattaforma di interoperabilità e servizi, secondo lo standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) - Fascicolo sanitario elettronico da parte del Soggetto Attuatore (MEF – Sistema Tessera Sanitaria)
- La Regione/Provincia Autonoma, sulla base dei decreti e delle linee guida nazionali di prossima emanazione per il potenziamento del FSE, ai sensi della normativa vigente, predispone i piani regionali di adeguamento.
- Con decreto da pubblicare non oltre settembre 2022, saranno dettagliate le milestone e i target intermedi a livello regionale, nonché le risorse disponibili per ogni Regione/Provincia Autonoma per l'adeguamento dell'FSE e l'attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al punto precedente, garantendo almeno il 40% alle regioni del sud
- La Regione/Provincia Autonoma, che, sulla base del piano regionale e delle risorse stabilite con decreto, interviene autonomamente nel potenziamento, dovrà comunicare periodicamente lo stato di avanzamento in base agli indicatori stabiliti con le Linee Guida nazionali di cui al primo punto tramite i sistemi di monitoraggio
- La Regione/Provincia Autonoma, che, sulla base del piano regionale, intende avvalersi dell'infrastruttura nazionale, comunicherà al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Struttura della Presidenza del Consiglio responsabile per l'innovazione tecnologica e la struttura di gitale per coordinare il piano regionale e il raggiungimento di target e milestone intermedi di cui al secondo punto.

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE

- La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022
- Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo.
- Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR, stabilite con decreto di cui al paragrafo precedente, ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR che costituisce e importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico Adozione, alimentazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
FABBISOGNO	Il Fabbisogno sarà determinato sulla base del completamento dell'Assessment e indicato nel Decreto di ripartizione delle risorse destinate al sub-investimento, che sarà emanato non oltre settembre 2022
IMPORTO COMPLESSIVO A LIVELLO NAZIONALE OGGETTO DEL SUCCESSIVO DECRETO DI RIPARTIZIONE REGIONALE (Sub intervento (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni")	€ 610.389.999,93

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Cutoff per digitalizzazione nativa di tutti i documenti dei FSE. I documenti devono essere nativi digitali fin dall'inizio e coerenti con i recenti standard FHIR.	T4 2024	
Target	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)	T4 2025	
Target	Tutte le Regioni/Province autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico	T2 2026	

GANTT

Linee di attività
2022
2023
2024
2025
2026
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 Taglio dopo il quale tutte le cartelle cliniche elettroniche (Eletronic Health Record) devono essere digitalmente native
2 I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (85%)
3 Tutte le Regioni/Province Autonome hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
Mls/Target EU
Mls/Target ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, Art.21 recante: "Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale, convertito con la L. n. 25 del 28 marzo 2022.*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6 C1	**1.3**	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**	**[inserire importo Regionale per l'investimento]**	**[inserire 100% dell'importo regionale]**	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	0 %	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100 %		**[inserire 100% della quota assegnata tagging]**

La Regione/Provincia Autonoma s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DSNH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

Componente 2 – Investimento 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – di cui sub investimento 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK…) – Action Plan

C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali

OBIETTIVO PNRR	
TARGET NAZIONALE	**4** nuovi flussi informativi nazionali
DESCRIZIONE CID	Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.
REQUISITI TARGET M6 C2 10	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari.
REQUISITI TARGET M6 C2 15	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma, al fine di fornire specifici contributi ai Gruppi di Lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi informativi sanitari, procede ad effettuare un'apposita analisi volta ad individuare gli eventuali gap funzionali ed informativi per singolo flusso. ▪ La Regione procede a pianificare gli interventi tecnologici ed organizzativi necessari all'adeguamento informativo/funzionale. ▪ La Regione/Provincia Autonoma, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute del DM recante il regolamento del flusso, procede al recepimento (adozione) dell'articolato DM tramite apposito atto normativo. ▪ La Regione/Provincia Autonoma, nell'ambito della fase di implementazione dei flussi definiti a livello nazionale, procede a definire i parametri di controllo al fine di verificare i flussi prodotti a livello aziendale prima della trasmissione al Ministero della salute. ▪ La Regione/Provincia Autonoma e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno stabilito per l'investimento in oggetto di ricorrere a procedure aggregate di affidamento (cfr. art. 5 comma 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo) che, qualora già disponibili, si dettagliano di seguito: [specificare]. (inserire se afferente) ▪
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. ▪ Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	**4** nuovi flussi informativi
FABBISOGNO	[N/A]
IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR: € 2.060.487,33 Importo delle risorse di Regione Emilia-Romagna € 400.000,00

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale e consultori familiari	T1 2023	
Target	Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale - Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) - Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria. .	T1 2025	

GANTT

	Linee di attività	2022				2023				2024				2025				2026			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi per singolo flusso (contributi regionali): assistenza riabilitativa e consultori																				
2	Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi in merito alla verifica del livello di copertura informatica/gestionale																				
3	Predisposizione e approvazione a livello nazionale dell'articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter di approvazione*																				
4	Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per assistenza riabilitativa e consultori familiari																				
5	Individuazione degli eventuali gap funzionali e informativi per singolo flusso (contributi regionali): ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria																				
6	Trasmissione dei contributi regionali ai Gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale per la definizione dei nuovi flussi in merito alla verifica del livello di copertura informatica/gestionale																				
7	Predisposizione e approvazione a livello nazionale dell'articolato DM recante il regolamento dei flussi ed iter di approvazione*																				
8	Recepimento (adozione) con atto regionale del decreto ministeriale di istituzione dei 2 nuovi flussi per ospedali di comunità e servizi di assistenza primaria																				

*attività di competenza del Ministero della Salute

MIs/Target EU MIs/Target ITA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *[inserire normativa regionale]*
- *[inserire normativa regionale]*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 1.3.2.

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**1.3**	**Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione**	**2.060.487,33**	**2.060.487,33**	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	100 %		**2.060.487,33**

La Regione/Provincia Autonoma s'impegna, con riferimento al suddetto investimento, a rispettare le percentuali del 100% (tag digitale) indicate e a rispettare le eventuali ulteriori indicazioni in materia che saranno trasmesse con successive circolari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DSNH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 1.3 è riportato nella tabella 10 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al presente Piano e quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Per tale investimento, all'interno della "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", sono riportate le schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH. Nello specifico, le schede sono di seguito indicate:

- scheda 3 "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- scheda 4 "Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario";
- scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";
- scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud".

Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale - Action Plan

C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale

OBIETTIVI NAZIONALI	
TARGET EUROPEO	Assegnazione di **2.700** borse di studio per la formazione specifica in medicina generale
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso specifico di medicina generale.
REQUISITI CID TARGET M6 C2 14	Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	▪ L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. ▪ I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione.	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	Per ciascun triennio formativo (2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026) nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze: ▪ La Commissione Salute definisce il fabbisogno formativo regionale di MMG per il triennio specifico. Il Coordinamento regionale trasmette tale fabbisogno al Ministero della Salute. ▪ Il Ministero della Salute effettua il riparto delle risorse per il finanziamento delle borse aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale per il medesimo triennio. ▪ La Commissione Salute decide la data del concorso nazionale per accedere ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Vengono quindi pubblicati i bandi regionali e successivamente svolto il concorso nazionale nella data stabilita. ▪ Viene pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, ogni Regione predispone l'elenco degli assegnatari di borsa e comunica la data di inizio corso. ▪ Le Regioni assegnano le borse e trasmettono al Ministero della Salute, anche attraverso l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR , entro il 1 giugno di ogni anno, la documentazione necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione, con riferimento a tutte le borse assegnate per il triennio formativo ed in particolare l'elenco degli assegnatari di borsa e l'elenco degli iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale. ▪ Le regioni provvedono ad aggiornare costantemente i dati inseriti nel sistema informatico predetto al fine di garantire il necessario per il monitoraggio e la rendicontazione.
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle voci di costo dell'investimento nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite dal Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	Definito con Decreto del Ministero della Salute del 2/11/2021 pari a 183 borse di studio da dividere in tre corsi (61 borse a corso per 3 corsi)
IMPORTO ASSEGNATO	DM del 2 novembre 2021 con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento delle prime 900 borse aggiuntive relative al triennio formativo 2021-2024. Tale decreto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti con Provv. n. 2963 del 07/12/2021. Alla Regione Emilia-Romagna sono stati assegnati € 2.303.834,58

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Target	Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021-2024	T2 2022	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2022	
Target	Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024 e 2022-2025.	T2 2023	
Milestone	Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale	T4 2023	
Target	Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026.	T2 2024	

GANTT

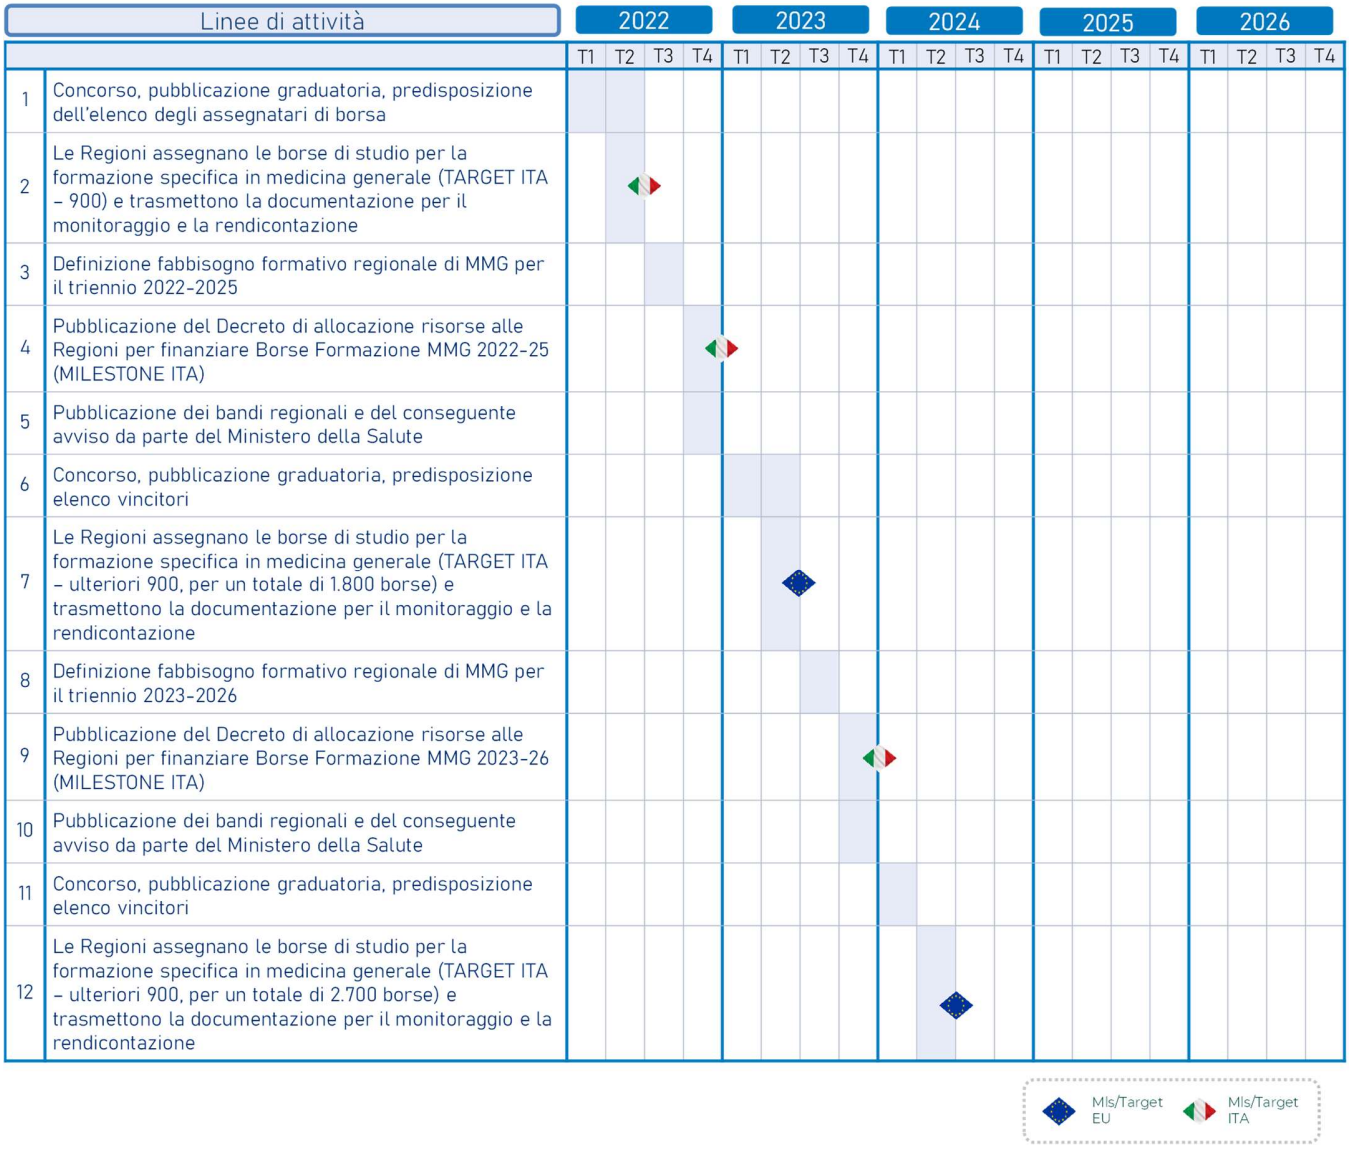

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *D. Lgs. 368/1999 e D.M. Salute 7 marzo 2006*
- *DGR 726/2019*

DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL”

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” all’investimento 2.2 (a).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]	
PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**2.2 (a)**	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale**	**€ 2.303.834.58**	**€ 2.303.834.58**	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

6.10. Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere - Action Plan

C2 – 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

OBIETTIVI NAZIONALI

TARGET NAZIONALE	**293.386** partecipanti
DESCRIZIONE CID	Questo investimento consiste nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il personale del SSN.
REQUISITI TARGET M6 C2 29/30	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto approvato nel quadro di ripartizione allegato 1 al Piano operativo.

INDICATORE COMUNE	Descrizione	Popolamento
10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione – per gli interventi riferiti alla formazione in infezioni ospedaliere.	▪ L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ed età. ▪ I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione.	▪ Semestrale

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO	▪ La Regione/Provincia Autonoma completa la procedura per la selezione dei provider dei corsi di formazione a marzo 2023, al fine di raggiungere il numero target complessivo in termini di partecipanti coinvolti tenendo conto delle indicazioni riportate all'interno dell'Allegato 5 del presente Piano operativo. ▪ L'adesione al programma da parte dei professionisti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale operanti nelle strutture ospedaliere dovrà essere accreditata ECM, ferma restando la specificità del Modulo D dell'Allegato 5 del presente Piano operativo. ▪ Il programma viene sviluppato da ciascuna regione/P.A. ed è articolato nelle sue diverse componenti (corsi/moduli) sulla base delle indicazioni nazionali, di cui al suddetto Allegato 5, tenendo in considerazione le peculiarità di ogni regione/P.A. e i diversi setting. A tale scopo si valorizzano le competenze specifiche dei vari stakeholders presenti sul territorio, anche attraverso la collaborazione con le Università, gli IRCSS, l'Agenas e l'Istituto Superiore di Sanità. ▪ Il programma deve essere sviluppato in modalità blended (modalità mista in ambienti di apprendimento diversi che includano formazione frontale in aula e apprendimento online), prevedendo sia una formazione teorica, che degli approfondimenti pratici a livello locale presso le strutture sanitarie di afferenza dei partecipanti, assicurando così la possibilità di formazione attraverso la metodologia learning by doing, considerata una delle strategie didattiche più efficaci in materia. ▪ In ragione dei diversi profili professionali e delle diverse aree di attività dei destinatari del corso, questo dovrà includere sia moduli che forniscano conoscenze relative ad un approccio di base trasversale sia approfondimenti specifici per le diverse professionalità/aree di attività. ▪ […]
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE	▪ La Regione/Province Autonome dettaglia le risorse economiche assegnate nelle principali voci di costo dell'investimento e definisce eventuali oneri per esigenze specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto applicabili, i fornite dal mef con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022. ▪ Nel caso in cui il presente Action Plan evidenziasse un fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede capitolo. ▪ Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base dell'effettivo fabbisogno, fermo restando l'importo totale assegnato dal PNR che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse PNRR.

OBIETTIVI REGIONALI

TARGET REGIONALE	22.603
FABBISOGNO	N/A
IMPORTO ASSEGNATO	Importo assegnato alla Regione dal PNRR Euro 6.165.531,74

MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Regione/Provincia Autonoma	Totale
Totale corsi	*50*
di cui da procedure regionali	*2*
di cui da procedure aziendali/altro	*48*

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Completamento procedure di selezione dei provider	T1 2023	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T3 2024	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T1 2025	
Milestone	Completamento della procedura di registrazione per i corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere	T4 2025	
Target	Numero di personale formato nel campo delle infezioni ospedaliere	T2 2026	

GANTT

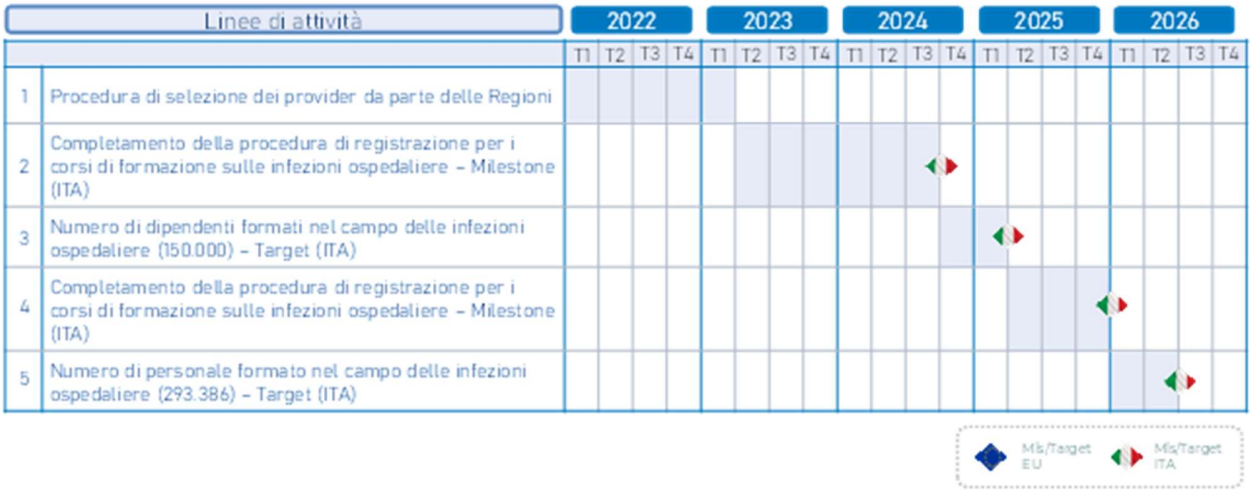

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Determinazione n. 832 del 19/01/2022 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE "FORMAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'ANTIBIOTICORESISTENZA"]*

DIMENSIONE "GREEN" E DIMENSIONE "DIGITAL"

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi "green" e "digital" sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l'ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie.

La tabella di seguito riportata sintetizza la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione "green" e quella "digital" all'investimento 2.2 (b).

(tabella non modificabile da Regione)

Missione	Codifica	Riferimenti Investimenti	Totale Risorse per Regione [€]	Quota assegnata tagging [€]	Campo d'intervento Green	% Green Tag	Campo d'intervento Digital	% Digital Tag	Quote assegnate [€]

PNRR - Assistenza di prossimità e telemedicina									**Green**	**Digital**
M6C2	**2.2 (b)**	**Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere**	**6.165.531,74**	**6.165.531,74**	123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%				

DO NO SIGNIFICANT HARM

Il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art.18 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

Il dettaglio delle valutazioni DNSH relative all'investimento 2.2 è riportato nella tabella 11 dell'Allegato 3 al presente Piano.

La Regione/Provincia Autonoma, nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni contenute nel suddetto Allegato 3.

7. Rispetto principi direttiva in materia Disabilità

In generale, tutti gli interventi previsti e i servizi innovativi introdotti contribuiranno a migliorare la qualità dell'assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di:

Accessibilità

Nell'implementazione dei progetti sarà assicurata la consultazione delle associazioni con disabilità. Come previsto dall'art. 9 della Convenzione ONU, nella realizzazione/adeguamento delle strutture di prossimità sarà garantito l'accesso all'ambiente fisico mediante l'abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche, creando ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Inoltre, lo sviluppo della telemedicina e degli investimenti tecnologici previsti in ogni progetto strutturale, contribuiranno a favorire l'accesso alle informazioni e alla comunicazione da parte di tutti gli assistiti.

Progettazione universale

Gli interventi agevoleranno la fruibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi da parte di tutti i soggetti, a prescindere dalle condizioni di salute. Promuoveranno inoltre una presa in carico personalizzata, che tenga conto delle condizioni sanitarie e sociosanitarie, nonché, delle preferenze del singolo individuo, promuovendo i principi dell'empowerment e della co-produzione dei servizi.

Promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione

Gli interventi mirano ad integrare i servizi sanitari e i diversi stakeholder coinvolti per una presa in carico complessiva della persona al fine di migliorare il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti con condizioni croniche e alle categorie di popolazione più vulnerabili, come le persone con disabilità.

il potenziamento dell'assistenza domiciliare, della comunità di riferimento e il potenziamento delle cure intermedie sono infatti fondamentali per fornire sostegno alle persone con disabilità, assicurando servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona sul proprio territorio, a partire proprio dai servizi domiciliari.

L'obiettivo è quello di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona nel proprio ambiente di vita e lavoro, favorendo la presa in carico nella comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari della persona.

Non discriminazione

Il potenziamento dei servizi con la definizione di standard e modelli organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale, consentirà di ridurre le disuguaglianze sia in termini di accessibilità che di servizi, assicurando outcome di salute uniformi sull'intero territorio nazionale.

8. Equità di Accesso

Sezione da compilare descrivendo brevemente come gli interventi regionali si integrano sinergicamente per migliorare l'equità di accesso e gli outcome di salute a livello territoriale, specificando in particolare le azioni di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia della rete dell'assistenza territoriale, al fine di garantire omogeneità nella capacità di dare risposte integrate (di natura sanitaria e sociosanitaria), nonché equità di accesso alle cure.

La Casa della Comunità (CdC) è lo strumento per eccellenza che garantisce l'equità di accesso ai cittadini in quanto diverrà il luogo fisico di riferimento per la comunità su cui insiste, per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria al fine di trovare risposta ad un proprio bisogno di salute. La Casa della Comunità da un lato permetterà lo sviluppo di efficaci azioni in termini di prevenzione della salute e dall'altro limiterà significativamente accessi inappropriati alle strutture ospedaliere. Accanto alla Casa della Comunità, nell'ambito dell'offerta territoriale, vi sarà l'Ospedale di Comunità ovvero una struttura sanitaria di ricovero che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità anch'essa di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio. A completare il modello della nuova assistenza territoriale vi sarà la Centrale Operativa Territoriale (COT) che svolgerà una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza.

9. Rispetto principi in materia di pari opportunità di genere e generazionali

Sezione da compilare descrivendo brevemente come gli interventi regionali siano volti a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 77/2021 che ha affidato alle Linee Guida adottate con decreto del 7 dicembre 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e del Ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nonché il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Disabilità, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, la definizione degli orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni contenute nello stesso articolo 47.

Gli interventi regionali previsti dalla component 1 e dalla component 2 nella fase di progettazione ed esecuzione, per la parte propriamente legata agli appalti (lavori, tecnologie e sistemi ICT), favorirà quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 77/2021.

Nella futura attivazione delle Case della Comunità, delle COT e degli Ospedali di Comunità si terrà conto dei principi di pari opportunità di genere e generazionali con particolare attenzione all'occupazione giovanile, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

Le attività di digitalizzazione concorreranno, con un adeguata formazione a tutti i soggetti interessati, a ridurre il digital divide cioè il divario tra chi ha accesso effettivo alle nuove tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso.

10.Modalità di monitoraggio e rendicontazione

La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede di monitoraggio per ciascun investimento. Tale monitoraggio avverrà attraverso il sistema Regis sulla base di tempistiche prestabilite.

Nello specifico, si riportano di seguito alcune indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, per garantire la corretta redazione delle schede:

- **Step attuativo-procedurale**: in questa colonna sono riportati i passi procedurali/amministrativi utili per la realizzazione concreta dell'investimento al fine di rispettare milestone/target EU e nazionali;

- **Data inizio e fine:** in questa colonna sono riportate le date presunte, di inizio e fine, dello step attuativo-procedurale utili a comprendere la durata della procedura posta in essere. È sempre richiesta la valorizzazione della data di fine procedura (anche previsionale), al fine di rendere più facile l'individuazione delle scadenze programmate.

- **Strumento/Atto:** in questa colonna viene riportato lo strumento o l'atto dello step attuativo-procedurale (ad esempio: bando di gara, determina a contrarre, Decreto Ministeriale, etc.).
- **Note/Criticità:** in questa colonna sono riportate le presunte criticità o elementi degni di nota relativi alla procedura in essere.

Il dettaglio delle schede di monitoraggio procedurale relative a ciascun investimento sono riportate nell'Allegato 4 al presente Piano.

Tabella 2 - Dettaglio Monitoraggio investimento

Format cronoprogramma attuativo dei singoli investimenti				
Step attuativo procedurale	Data inizio	Data fine	Strumento/Atto	Note/Criticità

La Regione/Provincia Autonoma provvede, così come indicato nelle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR di cui alla Circolare n. 21/MEF, ai seguenti adempimenti:

- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di

garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- garantire il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della salute, nonché garantire la riferibilità delle spese al progetto finanziato;
- presentare, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi nei tempi e nei modi previsti dal presente Piano ed atti conseguenti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- garantire la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale delle spese sostenute e dei target realizzati in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- impegnarsi, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e ad inviare la documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei target e milestone del PNRR;
- si impegna, altresì, al rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;
- definire le modalità di implementazione e trasmissione delle informazioni e della

documentazione anche tramite il sistema informatico per il monitoraggio degli interventi PNRR utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della salute;

- prevedere negli atti di rendicontazione la dichiarazione di aderenza dei progetti e delle relative spese al principio DNSH *Tagging* clima e digitale, *Gender Equality*, Valorizzazione dei giovani e Riduzione dei divari territoriali (ove pertinente), in funzione delle ulteriori indicazioni che saranno emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese;
- attenersi alle modalità e a eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del Soggetto attuatore;
- attenersi alle modalità di presentazione dei SAL (se pertinente);
- attenersi alle modalità di erogazione dell'eventuale anticipo (eventuale richiesta di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria);
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- attenersi in maniera puntuale alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di "rendicontazione" delle spese;
- attenersi ai controlli e agli adempimenti propedeutici all'erogazione svolti dall'Amministrazione responsabile nonché ai termini entro i quali l'Amministrazione provvede all'erogazione.;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del progetto.

M6C1 1.1 *Case della Comunità e presa in carico della persona*

CUP	ENTE del SSR	RUP	HUB/SPOKE	SUPERFICIE Immobile	SUPERFICIE Intervento	Utilizzo Si/No	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B14E22000020006	Azienda USL di Piacenza	Gruppi_Luigi	HUB	2.750	848	no	FIORENZUOLA D'ARDA	PIACENZA	Garibaldi ,51/53	1.500.000,00 €	207.064,12 €
B34E22000050006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	HUB	9.095	530	sì	PIACENZA	PIACENZA	Barriera Milano ,2	233.219,62 €	0,00 €
B31B22000350006	Azienda USL di Piacenza	Gruppi_Luigi	HUB	5.478	2.263	no	PIACENZA	PIACENZA	Gadolini ,36	3.404.886,00 €	2.803.353,60 €
B11B22000280006	Azienda USL di Piacenza	Gruppi_Luigi	SPOKE	3.679	1.425	no	ROTTOFRENO	PIACENZA	Alicata ,snc	2.763.435,00 €	1.130.400,00 €
B47H22000160006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	HUB	5.330	20	sì	BORGONOVO VAL TIDONE	PIACENZA	Seminò ,20	35.000,00 €	0,00 €
B77H22000230006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	HUB	5.767	40	sì	CORTEMAGGIORE	PIACENZA	Libertà ,6	50.000,00 €	0,00 €
D94E21001760001	Azienda USL di Parma	Alinovi_Elena	SPOKE	409	409	no	PARMA	PARMA	Via Verona ,36/A	1.366.777,78 €	616.084,87 €
D61B21006400001	Azienda USL di Parma	Pozzati_Alessia	SPOKE	2.240	953	no	SORBOLO	PARMA	Via Gruppini ,snc	1.738.314,05 €	1.144.737,01 €
D94E21001770001	Azienda USL di Parma	Begarani_Nicola	SPOKE	12.096	1.144	sì	PARMA	PARMA	Via Gramsci ,14	192.784,36 €	0,00 €
D94E21001780001	Azienda USL di Parma	Saviano_Renato Maria	HUB	1.657	938	no	FIDENZA	PARMA	Via Carducci ,snc	3.295.819,07 €	903.577,71 €
D94E21001800001	Azienda USL di Parma	Maiorano_Daniele	HUB	3.224	1.676	sì	COLLECCHIO	PARMA	Via Berlinguer ,2	2.666.113,54 €	818.532,73 €
D94E21001810001	Azienda USL di Parma	Scaffardi_Silvia	HUB	9.075	384	sì	LANGHIRANO	PARMA	Via Allende ,2	817.944,70 €	278.976,20 €
D41B20001000002	Azienda USL di Parma	Alinovi_Elena	SPOKE	700	346	no	MONCHIO DELLE CORTI	PARMA	Va Brigata Julia ,23		755.000,00 €
D44E21001410001	Azienda USL di Parma	Saviano_Renato Maria	SPOKE	1.506	450	sì	SALA BAGANZA	PARMA	Via del Mulino ,snc	994.295,72 €	242.140,55 €
D24E21000540001	Azienda USL di Parma	Saviano_Renato Maria	SPOKE	526	900	sì	MEDESANO	PARMA	Via Rastelli ,2	1.605.847,78 €	479.159,54 €
G37H22000270006	Azienda USL di Reggio Emilia	Cavalli_Isabella	SPOKE	5.753	395	sì	ALBINEA	REGGIO NELL'EMILIA	PAPA GIOVANNI XXIII ,16	210.000,00 €	27.744,50 €
G84E21005170006	Azienda USL di Reggio Emilia	Tedeschini_Carlotta	SPOKE	2.255	2.110	no	REGGIO NELL'EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	Viale Risorgimento ,57	3.586.000,00 €	531.940,39 €
G31B21008430006	Azienda USL di Reggio Emilia	Carubbi_Monia	SPOKE	670	450	no	SAN MARTINO IN RIO	REGGIO NELL'EMILIA	Via Rivone ,snc	1.045.000,00 €	150.000,00 €
G88I21000800006	Azienda USL di Reggio Emilia	Carubbi_Monia	HUB	2.936	1.903	no	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	LARGO GRAMSCI ,3	4.474.561,66 €	857.047,81 €
G47H21064080006	Azienda USL di Reggio Emilia	Mazzi_Enzo	HUB	1.740	1.290	no	SAN POLO D'ENZA	REGGIO NELL'EMILIA	Frassati ,1	760.000,00 €	0,00 €
G74E21005030006	Azienda USL di Reggio Emilia	Malagoli_Chiara	SPOKE	900	160	sì	CASTELLARANO	REGGIO NELL'EMILIA	Radici in Monte (Località Roteglia) ,82	180.000,00 €	0,00 €
G69J21020070006	Azienda USL di Reggio Emilia	Malagoli_Chiara	HUB	834	373	sì	SCANDIANO	REGGIO NELL'EMILIA	PISTONI BLOSI ,1	350.000,00 €	40.158,00 €
G91B21007670006	Azienda USL di Reggio Emilia	Pacillo_Fabio	HUB	2.625	1.075	no	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO NELL'EMILIA	Partigiani ,snc	3.045.000,00 €	599.678,17 €
G21B21006580006	Azienda USL di Reggio Emilia	Pacillo_Fabio	SPOKE	637	470	no	VILLA MINOZZO	REGGIO NELL'EMILIA	Corso Prampa ,snc	990.000,00 €	160.000,00 €
G47H21064090006	Azienda USL di Reggio Emilia	Doddi_Domenico	SPOKE	750	236	sì	CARPINETI	REGGIO NELL'EMILIA	G. Di Vittorio ,6	185.000,00 €	0,00 €
J57H21008350006	Azienda USL di Modena	Cazzaniga_Elena Grazia Maria	SPOKE	572	572	no	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MODENA	VIA DANTE ALIGHIERI	100.000,00 €	18.910,80 €
J51B21005860006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	SPOKE	-	600	no	SAN FELICE SUL PANARO	MODENA	Via Mario Gelso Ascari	2.430.000,00 €	409.091,00 €
J44E21003370006	Azienda USL di Modena	Cazzaniga_Elena Grazia Maria	SPOKE	1.830	420	sì	CAVEZZO	MODENA	Dante Alighieri ,50	400.000,00 €	79.181,25 €
J37H21008500006	Azienda USL di Modena	Cazzaniga_Elena Grazia Maria	SPOKE	700	140	sì	GUIGLIA	MODENA	VIA REPUBBLICA ,30	50.000,00 €	6.564,40 €
J19J21027270006	Azienda USL di Modena	Dani_Giulia	HUB	15.878	1.662	sì	CASTELFRANCO EMILIA	MODENA	Piazza Grazie Deledda ,6	2.593.000,00 €	1.247.544,00 €
J87H21012910006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	SPOKE	4.488	3.725	sì	SASSUOLO	MODENA	Via Fratelli Cairoli ,19	1.510.000,00 €	288.368,91 €
J17H21007310006	Azienda USL di Modena	Scabbia_Marco	SPOKE	1.985	400	sì	FORMIGINE	MODENA	Mazzini ,15	150.000,00 €	36.044,92 €
J24E21003250006	Azienda USL di Modena	Scabbia_Marco	SPOKE	1.419	150	sì	MONTEFIORINO	MODENA	Casa della Volpe ,s.n	50.000,00 €	7.992,71 €
J64E21002570006	Azienda USL di Modena	Di Mecola_Nick	SPOKE	950	880	no	ZOCCA	MODENA	via Mauro Tesi ,1767	63.403,00 €	897.579,80 €
J51B21005870006	Azienda USL di Modena	Pizzi_Giulia	HUB	-	2.164	no	VIGNOLA	MODENA	STRADA PER SASSUOLO -	6.480.000,00 €	1.036.363,00 €
J71B21005190006	Azienda USL di Modena	Scabbia_Marco	SPOKE	-	770	no	PAVULLO NEL FRIGNANO	MODENA	Fausto Coppi ,s.n.c	2.769.750,37 €	274.737,50 €
J81B21014050006	Azienda USL di Modena	Scabbia_Marco	SPOKE	-	560	no	PIEVEPELAGO	MODENA	Matilde di Canossa ,4	2.113.088,78 €	429.000,00 €
J64E21002580006	Azienda USL di Modena	Bajesi_Ilaria	SPOKE	1.900	732	no	FANANO	MODENA	Sabatini ,31	1.039.500,00 €	197.727,00 €
E31B22001080006	Azienda USL di Bologna	Reggiani_Claudia	HUB	2.500	3.344	no	BOLOGNA	BOLOGNA	Faenza ,4	7.385.000,00 €	3.284.454,36 €
E91B22000740006	Azienda USL di Bologna	Emiliani_Franco	SPOKE	6.000	2.700	no	MOLINELLA	BOLOGNA	Via A.Costa ang. Via Don	6.530.000,00 €	1.417.520,00 €
E24E22000040006	Azienda USL di Bologna	Reggiani_Claudia	HUB	1.904	270	sì	VERGATO	BOLOGNA	dell'Ospedale ,1	400.000,00 €	64.265,00 €
E94E22000080006	Azienda USL di Bologna	Capra_Maurizio	SPOKE	957	660	sì	CASTENASO	BOLOGNA	Via Guglielmo Marconi	915.000,00 €	38.844,00 €
E51B22000790006	Azienda USL di Bologna	Grazi_Gianluca	SPOKE	1.040	830	no	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA	Enzo Palma ,1	2.160.000,00 €	246.394,00 €
E35F22000060006	Azienda USL di Bologna	Emiliani_Franco	HUB	3.734	307	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Via S. Isaia ,94	565.000,00 €	109.357,00 €
E39J22000790006	Azienda USL di Bologna	Sarti_Francesco	HUB	2.510	335	sì	ZOLA PREDOSA	BOLOGNA	PIAZZA DI VITTORIO ,1	470.000,00 €	62.650,00 €
E94E22000090006	Azienda USL di Bologna	Amaducci_Niccolò	SPOKE	1.200	102	sì	SASSO MARCONI	BOLOGNA	VIA BERTACCHI ,11	250.000,00 €	66.959,00 €
E14E22000480006	Azienda USL di Bologna	Landini_Marco	SPOKE	848	300	sì	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BOLOGNA	SENSI ,14-2	290.000,00 €	22.118,00 €
E44E22000130006	Azienda USL di Bologna	Francavilla_Francesco Maria	SPOKE	990	1.120	sì	VALSAMOGGIA	BOLOGNA	VIALE DEI MARTIRI,10/B	2.240.000,00 €	487.565,00 €
E64E22000080006	Azienda USL di Bologna	Reggiani_Claudia	HUB	3.525	600	no	SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA	DELLA REPUBBLICA ,11	1.405.000,00 €	185.411,00 €
E39J22000800006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	SPOKE	1.241	132	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	COLOMBI ,3	130.000,00 €	55.260,00 €
E37H22000440006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	SPOKE	3.540	575	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Pietro Mengoli ,32	725.000,00 €	46.546,00 €
E97H22000350006	Azienda USL di Bologna	Capra_Maurizio	SPOKE	-	684	no	BARICELLA	BOLOGNA	Via Europa ,15	474.044,45 €	74.653,00 €
E34E22000070006	Azienda USL di Bologna	Capra_Maurizio	HUB	4.098	150	sì	CREVALCORE	BOLOGNA	Viale della Libertà ,171	205.000,00 €	64.269,00 €

E34E22000080006	Azienda USL di Bologna	Capra_Maurizio	SPOKE	576	666	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Via Luigi Pirandello ,8	510.000,00 €	114.073,00 €
E64E22000090006	Azienda USL di Bologna	Capra_Maurizio	SPOKE	1.490	140	sì	CALDERARA DI RENO	BOLOGNA	Via Primo Maggio ,15	90.000,00 €	37.273,00 €
H27H22000740006	Azienda USL di Imola	Faiello_Domenico Alessandro	HUB	19.600	2.367	sì	IMOLA	BOLOGNA	Viale Amendola ,2	2.900.000,00 €	290.000,00 €
H77H22000100006	Azienda USL di Imola	Scala_Simona	SPOKE	6.188	800	sì	MEDICINA	BOLOGNA	Viale Saffi ,1	728.474,23 €	72.847,40 €
H87H22000200006	Azienda USL di Imola	Faiello_Domenico Alessandro	HUB	15.853	154	sì	CASTEL SAN PIETRO TERME	BOLOGNA	Oriani ,1	100.000,00 €	0,00 €
E78I21000460006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	25.035	1.070	sì	FERRARA	FERRARA	corso Giovecca ,203	4.507.280,88 €	1.072.538,50 €
E63D21006630006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	14.671	3.412	sì	COPPARO	FERRARA	Roma ,18	3.201.469,00 €	694.231,34 €
E23D21010540006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	13.437	1.700	sì	BONDENO	FERRARA	Dazio ,113/118	147.300,00 €	0,00 €
E53D21006140006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	9.841	2.039	sì	COMACCHIO	FERRARA	Via Raimondo Felletti ,2	114.238,44 €	0,00 €
E97H21011530006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	13.997	1.050	sì	PORTOMAGGIORE	FERRARA	Via Edmondo De Amicis	1.461.288,00 €	292.017,00 €
E43D21007160006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	HUB	9.748	1.495	sì	CODIGORO	FERRARA	Via Felice Cavallotti ,347	161.324,00 €	0,00 €
G67H21029780001	Azienda USL della Romagna	Amadesi_Luca	SPOKE	12.546	698	sì	RAVENNA	RAVENNA	VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO ,134	100.000,00 €	0,00 €
G61B21011100001	Azienda USL della Romagna	Luzi_Francesca	HUB	33.750	1.019	no	RAVENNA	RAVENNA	ANTICA MILIZIA ,SNC	6.817.790,26 €	1.495.616,00 €
G88I21000510001	Azienda USL della Romagna	Amadesi_Luca	HUB	5.875	1.323	sì	CERVIA	RAVENNA	DELL'OSPEDALE ,17	1.600.000,00 €	187.256,00 €
G41B21011020001	Azienda USL della Romagna	Fiori_Eleonora	HUB	1.062	874	sì	LUGO	RAVENNA	Via Rivali San Bartolomeo	1.700.000,00 €	579.033,00 €
G37H21032920001	Azienda USL della Romagna	Perrella_Fabiana	HUB	3.600	1.400	sì	BAGNACAVALLO	RAVENNA	Vittorio Veneto ,9	150.000,00 €	0,00 €
G27H21036710001	Azienda USL della Romagna	Perrella_Fabiana	HUB	3.300	350	sì	ALFONSINE	RAVENNA	Reale ,49/51	100.000,00 €	0,00 €
G21B21006510001	Azienda USL della Romagna	Masinelli_Elena	HUB	1.749	831	sì	FAENZA	RAVENNA	Viale Risorgimento ,1, 3	1.600.000,00 €	584.176,00 €
G77H21079270001	Azienda USL della Romagna	Perrella_Fabiana	HUB	1.860	1.860	no	CASTEL BOLOGNESE	RAVENNA	Viale Roma ,2	100.000,00 €	0,00 €
G61B21009680001	Azienda USL della Romagna	Checcoli_Fabrizio	HUB	5.836	3.325	no	FORLÌ	FORLÌ-CESENA	via Cristoforo Colombo - viale Vespucci ,snc	9.400.000,00 €	2.527.273,00 €
G77H21079260001	Azienda USL della Romagna	Gabrielli_Erika	HUB	9.639	240	sì	FORLIMPOPOLI	FORLÌ-CESENA	Duca d'Aosta ,33	100.000,00 €	0,00 €
G81B21007560001	Azienda USL della Romagna	Gozzoli_Andrea	SPOKE	3.047	545	no	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FORLÌ-CESENA	via Ravaglioli - via Cantarelli ,snc	1.600.000,00 €	522.727,00 €
G77H21079250001	Azienda USL della Romagna	Gabrielli_Erika	HUB	2.500	2.500	no	MODIGLIANA	FORLÌ-CESENA	Piazza Oberdan ,6/A	400.000,00 €	52.052,00 €
G21B21005520001	Azienda USL della Romagna	Gozzoli_Andrea	HUB	6.534	1.250	no	CESENATICO	FORLÌ-CESENA	A. Saffi ,s.n.c.	2.100.000,00 €	852.355,00 €
G37H21032940001	Azienda USL della Romagna	Fabiani_Michele	HUB	4.767	200	sì	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FORLÌ-CESENA	Corso Perticari ,119	400.000,00 €	60.454,55 €
G47H21058740001	Azienda USL della Romagna	Bruschi_Elisa	SPOKE	5.246	435	sì	BAGNO DI ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	Guglielmo Marconi ,36	300.000,00 €	0,00 €
G57H21023720001	Azienda USL della Romagna	Adamo_Giuseppe	HUB	5.050	570	sì	MERCATO SARACENO	FORLÌ-CESENA	Decio Raggi ,16	400.000,00 €	57.727,27 €
G54E21004850001	Azienda USL della Romagna	Finocchiaro_Letizia	SPOKE	4.318	625	sì	BELLARIA-IGEA MARINA	RIMINI	DON LORENZO MILANI	1.600.000,00 €	526.163,64 €
G47H21058730001	Azienda USL della Romagna	Pasini_Susi	HUB	9.721	660	sì	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RIMINI	Pedrignone ,3	200.000,00 €	0,00 €
G97H21029370001	Azienda USL della Romagna	Pasini_Susi	HUB	9.710	200	sì	NOVAFELTRIA	RIMINI	XXIV MAGGIO ,174	100.000,00 €	0,00 €
G81B21007570001	Azienda USL della Romagna	Vandi_Roberta	HUB	3.246	616	no	RICCIONE	RIMINI	V. Veneto/Pavia ,snc	1.600.000,00 €	1.124.703,07 €
G64E21004500001	Azienda USL della Romagna	Vandi_Roberta	HUB	2.900	1.660	sì	MORCIANO DI ROMAGNA	RIMINI	Arno ,42	1.000.000,00 €	151.252,46 €

M6C1 – 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)

1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)	ENTE del SSR	RUP	SUPERFICIE Immobile	SUPERFICIE Intervento	Utilizzo Si/No	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B34E22000070006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	4.375	200	sì	PIACENZA	PIACENZA	Monte Carevolo ,snc	334.925,19 €	0,00 €
B44E22000050006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	5.330	120	sì	BORGONOVO VAL TIDONE	PIACENZA	strada Seminò ,20	148.768,90 €	0,00 €
B77H22000250006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	5.767	20	sì	CORTEMAGGIORE	PIACENZA	Libertà ,6	15.232,68 €	0,00 €
D94E22000060006	Azienda USL di Parma	Begarani_Nicola	12.096	187	sì	PARMA	PARMA	Via Gramsci ,14	257.122,70 €	21.395,31 €
D94E21001860001	Azienda USL di Parma	Begarani_Nicola	12.096	167	sì	PARMA	PARMA	Gramsci ,14	115.361,69 €	31.876,20 €
D44E22000000001	Azienda USL di Parma	Mambriani_Andrea	731	125	sì	SALA BAGANZA	PARMA	Via del Mulino ,1	80.000,00 €	0,00 €
D58I22000320006	Azienda USL di Parma	Saviano_Renato Maria	11.995	110	sì	FIDENZA - LOC. VAIO	PARMA	Via Don Enrico Tincati, 5	109.818,51 €	0,00 €
D64E21001670001	Azienda USL di Parma	Degiovanni_Roberto	18.506	220	sì	BORGO VAL DI TARO	PARMA	Via Benefattori ,12	229.697,35 €	81.228,43 €
G84E21005190006	Azienda USL di Reggio Emilia	Tedeschini_Carlotta	2.255	145	sì	REGGIO NELL'EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	Viale Risorgimento ,57	289.000,00 €	42.498,47 €
G47H21064070006	Azienda USL di Reggio Emilia	Cavalli_Isabella	2.300	80	sì	CORREGGIO	REGGIO NELL'EMILIA	CIRCONDARIA ,26	5.000,00 €	0,00 €
G84E21005180006	Azienda USL di Reggio Emilia	Carubbi_Monia	580	80	sì	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	VIA ROSARIO ,3	5.000,00 €	0,00 €
G47H21064100006	Azienda USL di Reggio Emilia	Mazzi_Enzo	1.740	450	no	REGGIO NELL'EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	Frassati ,1	290.000,00 €	0,00 €
G91B21007690006	Azienda USL di Reggio Emilia	Pacillo_Fabio	2.625	150	no	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO NELL'EMILIA	dei Partigiani ,snc	337.166,90 €	33.219,98 €
J74E21002220006	Azienda USL di Modena	Dani_Giulia	6.532	101	sì	FINALE EMILIA	MODENA	VIALE TRENTO E TRIESTE	164.847,66 €	34.636,00 €
J91B21005010006	Azienda USL di Modena	Romio_Pasquale Giovanni Francesco	2.403	100	no	CARPI	MODENA	VIA BALDASSARRE PERUZZI ,s.n.c.	164.847,66 €	26.024,59 €
J97H21037550006	Azienda USL di Modena	Di Mecola_Nick	13.785	270	sì	MODENA	MODENA	VIALE VITTORIO VENETO	269.636,69 €	59.813,21 €
J17H21007320006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	660	145	no	CASTELFRANCO EMILIA	MODENA	PIAZZA GRAZIA DELEDDA	164.847,66 €	26.024,59 €
J57H21008360006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	21.425	163	sì	VIGNOLA	MODENA	PAPA S.S. GIOVANNI PAOLO II ,31	179.847,66 €	31.749,89 €
J77H21009710006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	24.815	135	sì	PAVULLO NEL FRIGNANO	MODENA	SUORE DI SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO ,5	124.847,66 €	6.349,98 €
J87H21012920006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	4.488	101	sì	SASSUOLO	MODENA	VIA FRATELLI CAIROLI ,19	164.847,66 €	26.024,50 €
E37H22000360006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	161.732	250	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Largo Bartolo Nigrisoli ,2	1.351.783,92 €	50.246,08 €
E37H22000370006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	2.900	50	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	S. Isaia ,94/A	19.000,00 €	0,00 €
E37H22000380006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	7.574	34	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Svampa ,8	13.000,00 €	0,00 €
E37H22000390006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	3.982	35	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Beroaldo ,4	34.000,00 €	0,00 €
E67H22000300006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	2.925	60	sì	SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA	Repubblica ,11	59.000,00 €	0,00 €
E57H22000260006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	29.100	34	sì	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA	Enzo Palma ,1	13.000,00 €	0,00 €
E77H22000770006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	5.280	39	sì	SAN PIETRO IN CASALE	BOLOGNA	Asia ,61	38.000,00 €	0,00 €
E89J22000770006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	9.260	35	sì	CASALECCHIO DI RENO	BOLOGNA	Cimarosa ,5/2	5.000,00 €	0,00 €
E57H22000270006	Azienda USL di Bologna	Canarini_Davide	12.705	34	sì	ALTO RENO TERME	BOLOGNA	Oreste Zagnoni ,5	13.000,00 €	0,00 €
H27H22000750006	Azienda USL di Imola	Faiello_Domenico Alessandro	19.600	210	sì	IMOLA	BOLOGNA	Viale Amendola ,2	232.921,32 €	0,00 €
E77H21013560006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	25.035	300	sì	FERRARA	FERRARA	Corso Giovecca ,203	463.100,00 €	0,00 €
E27H21009310006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	13.437	50	sì	BONDENO	FERRARA	Via Dazio ,113/118	14.750,00 €	0,00 €
E97H21011540006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	19.798	82	sì	ARGENTA	FERRARA	Via Nazionale ,5	90.714,58 €	0,00 €
E56G21003260006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	9.841	53	sì	COMACCHIO	FERRARA	Via Raimondo Felletti ,2	30.713,00 €	0,00 €
G67H22000270001	Azienda USL della Romagna	Checcoli_Fabrizio	12.546	450	sì	RAVENNA	RAVENNA	Via Fiume Montone Abbandonato ,134	405.975,61 €	0,00 €
G68I22000270001	Azienda USL della Romagna	Carlini_Lorenzo	1.380	355	sì	FORLÌ	FORLÌ-CESENA	Carlo Forlanini ,34	406.200,00 €	0,00 €
G18I22000140001	Azienda USL della Romagna	Gabrielli_Erika	7.474	200	sì	SANTA SOFIA	FORLÌ-CESENA	Valbonesi ,1	253.700,00 €	0,00 €
G28I22000030001	Azienda USL della Romagna	Gozzoli_Andrea	7.579	250	sì	CESENATICO	FORLÌ-CESENA	C. Abba ,102	152.500,00 €	0,00 €
G38I22000150001	Azienda USL della Romagna	Montalti_Alessandra	4.767	180	sì	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FORLÌ-CESENA	Corso Perticari ,115	152.500,00 €	0,00 €
G18I22000160001	Azienda USL della Romagna	Gozzoli_Andrea	1.970	325	sì	CESENA	FORLÌ-CESENA	Corso Cavour ,180	253.700,00 €	0,00 €
G98I22000090001	Azienda USL della Romagna	Sabatini_Enrico	250	250	no	RIMINI	RIMINI	viale Settembrini ,2	240.000,00 €	0,00 €
G97H22000160001	Azienda USL della Romagna	Pasini_Susi	9.710	101	sì	NOVAFELTRIA	RIMINI	XXIV MAGGIO ,174	80.000,00 €	0,00 €
G42C22000270005	Azienda USL della Romagna	Perrella_Fabiana	1.470	101	sì	LUGO	RAVENNA	Viale Masi ,22	5.000,00 €	0,00 €
G22C22000250005	Azienda USL della Romagna	Perrella_Fabiana	1.120	50	sì	FAENZA	RAVENNA	Largo del Portello ,1	5.000,00 €	0,00 €
G82C22000250005	Azienda USL della Romagna	Vandi_Roberta	22.202	101	sì	RICCIONE	RIMINI	Frosinone ,7	5.000,00 €	0,00 €

M6 C1 – 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) Device				
CUP	**ENTE del SSR**	**RUP**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
B39J22001370006	Azienda USL di Piacenza	Franzosi_Matteo	278.101,44 €	0,00 €
D99J22000550001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	442.015,76 €	0,00 €
G89J22000610002	Azienda USL di Reggio Emilia	Gallo_Daniele	516.903,02 €	0,00 €
J49J22000660006	Azienda USL di Modena	Cecoli_Sonia	692.409,78 €	0,00 €
E39J22000670006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	863.690,46 €	0,00 €
H29J22000650006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	129.354,16 €	0,00 €
E59J22000510006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	334.681,38 €	0,00 €
G69J22000640006	Azienda USL della Romagna	Bazzocchi_Fabrizio	1.094.908,52 €	0,00 €

M6 C1 – 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) Interconnessione				
CUP	**ENTE del SSR**	**RUP**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
B39J22001310006	Azienda USL di Piacenza	Zazzera_Fabio	204.879,12 €	0,00 €
D99J22000540001	Azienda USL di Parma	Brambilla_Marco	325.226,71 €	0,00 €
G89J22000620002	Azienda USL di Reggio Emilia	Garlassi_Federica	380.320,86 €	0,00 €
J49J22000650006	Azienda USL di Modena	Viani_Simona	506.615,45 €	0,00 €
E99J22000640006	Azienda USL di Bologna	Ghedini_Pierfrancesco	634.760,18 €	0,00 €
H29J22000660006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	95.646,72 €	0,00 €
E59J22000540006	Azienda USL di Ferrara	Chiarini_Luca	246.087,14 €	0,00 €
G69J22000830006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	804.679,45 €	0,00 €

M6 C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

CUP	ENTE del SSR	RUP	SUPERFICIE Immobile	SUPERFICIE Intervento	Utilizzo Si/No	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B31B22000360006	Azienda USL di Piacenza	Gruppi_Luigi	5.478	2.205	no	PIACENZA	PIACENZA	Gadolini ,36	4.004.533,00 €	1.025.250,00 €
B27H22000190006	Azienda USL di Piacenza	Tagliaferri_Valerio	17.109	800	sì	CASTEL SAN GIOVANNI	PIACENZA	Il Giugno ,1	351.761,89 €	0,00 €
D94E21001840001	Azienda USL di Parma	Gallarotti_Roberto	6.668	1.368	no	PARMA	PARMA	Via XXIV Maggio ,snc	2.260.250,00 €	696.629,99 €
D94E21001850001	Azienda USL di Parma	Scaffardi_Silvia	9.075	1.430	no	LANGHIRANO	PARMA	Via Allende ,2	2.806.462,54 €	1.088.032,23 €
D64E21001660001	Azienda USL di Parma	Saviano_Renato Maria	982	444	no	SAN SECONDO PARMENSE	PARMA	Via Felice Cavallotti ,2	1.848.504,00 €	523.537,41 €
G84E21005200006	Azienda USL di Reggio Emilia	Mazzi_Enzo	18.468	1.115	sì	REGGIO NELL'EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	Viale Risorgimento ,80	2.460.000,00 €	337.375,94 €
G88I21000810006	Azienda USL di Reggio Emilia	Carubbi_Monia	2.936	1.325	sì	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	LARGO GRAMSCI ,3	2.851.670,00 €	504.426,06 €
G91B21007680006	Azienda USL di Reggio Emilia	Pacillo_Fabio	2.625	990	no	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO NELL'EMILIA	dei Partigiani ,/	2.775.000,00 €	507.503,40 €
J67H21010780006	Azienda USL di Modena	Dani_Giulia	1.900	350	sì	FANANO	MODENA	Via Sabatini ,31	200.000,00 €	42.288,00 €
J91B21005000006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	1.200	1.080	no	MODENA	MODENA	Camillo Guidelli ,snc	3.524.013,72 €	537.500,00 €
J51B21005880006	Azienda USL di Modena	Pizzi_Giulia	-	1.200	no	VIGNOLA	MODENA	STRADA PER SASSUOLO -	3.524.013,72 €	537.500,00 €
J51B21005890006	Azienda USL di Modena	Mirto_Gaetano	-	1.200	no	MARANELLO	MODENA	VIA CAPPELLA ,sn	3.524.013,73 €	537.500,00 €
E79J22000580006	Azienda USL di Bologna	Emiliani_Franco	5.280	950	sì	SAN PIETRO IN CASALE	BOLOGNA	Asia ,61	2.600.000,00 €	637.350,00 €
E51B22000760006	Azienda USL di Bologna	Grazi_Gianluca	1.040	1.180	no	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BOLOGNA	Enzo Palma ,1	2.700.000,00 €	491.894,00 €
E37H22000350006	Azienda USL di Bologna	Sarchese_Giancarlo	25.000	1.042	sì	BOLOGNA	BOLOGNA	Pelagio Palagi ,9	2.046.751,52 €	206.489,00 €
E49J22000590006	Azienda USL di Bologna	Francavilla_Francesco Maria	4.200	900	sì	VALSAMOGGIA	BOLOGNA	VIALE DEI MARTIRI ,10/B	3.850.000,00 €	406.670,00 €
E49J22000600006	Azienda USL di Bologna	Emiliani_Franco	1.039	805	sì	LOIANO	BOLOGNA	Via Roma ,8	2.300.000,00 €	257.510,00 €
H87H22000190006	Azienda USL di Imola	Faiello_Domenico Alessandro	15.853	1.725	sì	CASTEL SAN PIETRO TERME	BOLOGNA	Viale Oriani ,1	2.033.713,21 €	203.371,30 €
E78I21000470006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	25.035	853	sì	FERRARA	FERRARA	Corso Giovecca ,203	2.940.937,08 €	654.397,89 €
E47H21011590006	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	9.748	1.110	sì	CODIGORO	FERRARA	Felice Cavallotti ,347	2.291.554,00 €	423.509,29 €
G61B21009660001	Azienda USL della Romagna	Luzi_Francesca	33.750	1.900	no	RAVENNA	RAVENNA	ANTICA MILIZIA ,SNC	4.409.703,78 €	947.224,00 €
G88I21000520001	Azienda USL della Romagna	Amadesi_Luca	5.021	1.610	sì	RUSSI	RAVENNA	PIAZZA FARINI ,52	1.000.000,00 €	89.846,00 €

G77H22000470001	Azienda USL della Romagna	Gabrielli_Erika	9.639	1.250	sì	FORLIMPOPOLI	FORLÌ-CESENA	Duca d'Aosta ,33	100.000,00 €	0,00 €
G21B21005540001	Azienda USL della Romagna	Gozzoli_Andrea	6.534	1.650	no	CESENATICO	FORLÌ-CESENA	A. SAFFI ,s.n.c.	3.000.000,00 €	1.697.727,00 €
G91B21006610001	Azienda USL della Romagna	Carlini_Laura	7.500	1.766	no	RIMINI	RIMINI	Settembrini ,snc	3.200.000,00 €	2.161.040,71 €
G91B21006590001	Azienda USL della Romagna	Pasini_Susi	9.710	943	sì	NOVAFELTRIA	RIMINI	XXIV Maggio ,174	2.700.000,00 €	341.828,18 €
G67H21022100001	Azienda USL della Romagna	Vandi_Roberta	12.592	660	sì	CATTOLICA	RIMINI	Beethoven ,1	2.700.000,00 €	431.688,52 €

M6 C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello								
CUP	**ENTE del SSR**	**RUP**	**Titolo Progetto**	**Presidio Ospedaliero**	**DEA di I o II livello**	**Comune**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
B39J22002740006	Azienda USL di Piacenza	Zazzera_Fabio	Digitalizzazione del DEA di I e II Livello per Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Piacenza	080101#Ospedale "Guglielmo da Saliceto" Piacenza	DEA II	PIACENZA	5.460.936,32 €	0,00 €
D99J22000920001	Azienda USL di Parma	Brambilla_Marco	Digitalizzazione del DEA di I livello	080013#PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE (AUSL PARMA)	DEA I	PARMA	2.481.763,77 €	0,00 €
G89J22001320002	Azienda USL di Reggio Emilia	Foracchia_Marco	Digitalizzazione DEA II livello: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia	080021#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA	DEA II	REGGIO NELL'EMILIA	9.378.308,02 €	0,00 €
J99J22001020006	Azienda USL di Modena	Viani_Simona	Digitalizzazione del DEA I Livello	08003104#OSPEDALE "B. RAMAZZINI" CARPI	DEA I	CARPI	6.262.118,29 €	0,00 €
E39J22001200006	Azienda USL di Bologna	Ghedini_Pierfrancesco	Digitalizzazione DEA I e DEA II Livello: Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna	080053#OSPEDALE MAGGIORE C.A. PIZZARDI DI BOLOGNA	DEA II	BOLOGNA	12.714.051,92 €	0,00 €
H29J22000830006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	Digitalizzazione DEA I Livello: Ospedale Civile Nuovo "Santa Maria della Scaletta" di Imola	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DEA I	IMOLA	3.076.584,11 €	0,00 €
E19J22001030006	Azienda USL di Ferrara	Chiarini_Luca	Digitalizzazione DEA I e DEA II Livello: Ospedale del Delta di Lagosanto	080109#AZIENDA USL DI FERRARA OSPEDALE DEL DELTA DI LAGOSANTO	DEA I	LAGOSANTO	2.971.278,27 €	0,00 €
G69J22001120006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna DEA II Livello	080072#Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna	DEA II	RAVENNA	4.651.256,04 €	0,00 €
G69J22001130006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì DEA II Livello	080085#Ospedale Morgagni-Pierantoni Forli'	DEA II	FORLÌ	3.767.682,00 €	0,00 €
G19J22000790006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena DEA II Livello	080091#OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI CESENA	DEA II	CESENA	3.867.711,00 €	0,00 €
G99J22000700006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Infermi" di Rimini DEA II Livello	080095#Ospedale Infermi Rimini	DEA II	RIMINI	4.826.303,00 €	0,00 €
G49J22001080006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Umberto I" di Lugo DEA I Livello	080079#Ospedale Umberto I Lugo	DEA I	LUGO	2.017.212,00 €	0,00 €
G29J22000980006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Degli Infermi" di Faenza DEA I Livello	080082#Ospedale Degli Infermi Faenza	DEA I	FAENZA	1.942.193,00 €	0,00 €
G89J22000870006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	Sviluppo del sistema informativo dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione DEA I Livello	080100#Ospedale Ceccarini Riccione	DEA I	RICCIONE	1.183.653,00 €	0,00 €
F99J22001090001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Brambilla_Marco	Digitalizzazione del DEA di II livello	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	DEA II	PARMA	7.647.790,16 €	0,00 €
F99J22001320007	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Savigni_Roberto	Digitalizzazione del DEA II livello: Ospedale Policlinico di Modena	08090401#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	DEA II	MODENA	5.610.255,20 €	0,00 €
F99J22001330008	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Righini_Grazia	Digitalizzazione del DEA II livello: Ospedale Civile di Baggiovara	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	DEA II	MODENA	3.491.406,18 €	0,00 €
F39J22001040006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Capitani_Luca	Sviluppo del Sistema Informativo dell'Ospedale DEA II Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna DEA II Livello	080908#AZIENDA_OSPEDALIERO_UNIVERSITARIA_DI_BOLOGNA	DEA II	BOLOGNA	11.635.133,64 €	0,00 €
J79J22001060006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Chiarini_Luca	Digitalizzazione DEA I e II Livello: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Ospedale di Cona	080909#AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANT'ANNA OSPEDALE DI CONA	DEA II	FERRARA	5.626.023,58 €	0,00 €

M6 C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature Sanitarie

CUP	ENTE del SSR	RUP	Grande Apparecchiatura	Presidio Ospedaliero	Unità Operativa	Comune	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
B39J22002040006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	MAMMOGRAFI	08000403#OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI	UO RADIOLOGIA VAL TIDONE	Castel San Giovanni	184.787,30 €	0,00 €
B39J22002050006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	MAMMOGRAFI	08000405#OSPEDALE FIORENZUOLA D'ARDA	RADIOLOGIA	Fiorenzuola d'Arda	188.804,76 €	0,00 €
B39J22002060006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	ANGIOGRAFI	08000401#OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	CARDIOLOGIA	Piacenza	891.564,00 €	0,00 €
B39J22002070006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08000401#OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	PRONTO SOCCORSO	Piacenza	159.942,00 €	0,00 €
B39J22002080006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08000401#OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	PRONTO SOCCORSO	Piacenza	159.942,00 €	0,00 €
B39J22002090006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	405101#OSCO BOBBIO	RADIOLOGIA	Bobbio	159.942,00 €	0,00 €
B39J22002100006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	RMN A 1,5 T	08000403#OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI	RADIOLOGIA	Castel San Giovanni	1.323.910,88 €	0,00 €
B39J22002120006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	TAC A 128 STRATI	08000401#OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	RADIOLOGIA	Piacenza	372.270,00 €	0,00 €
B39J22002130006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	TAC A 128 STRATI	08000401#OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	RADIOLOGIA	Piacenza	378.107,00 €	0,00 €
B39J22002140006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	TAC A 128 STRATI	08000403#OSPEDALE CASTEL SAN GIOVANNI	RADIOLOGIA	Castel San Giovanni	380.657,00 €	0,00 €
B39J22002160006	Azienda USL di Piacenza	Menini_Sara	TAC A 128 STRATI	08000405#OSPEDALE FIORENZUOLA D'ARDA	RADIOLOGIA	Fiorenzuola d'Arda	378.107,00 €	0,00 €
D99J22001110001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	TAC A 128 STRATI	080013#OSPEDALE FIDENZA	Radiologia	Fidenza	338.000,00 €	0,00 €
D99J22001120001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	MAMMOGRAFI	513800#CENTRO SENOLOGICO BAGNASCO	Radiologia	Parma	184.713,58 €	0,00 €
D99J22001130001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	691301#POLIAMBULATORI PARMA OVEST	Radiologia	Parma	202.000,00 €	0,00 €
D99J22001140001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	011001#POLIAMB. DISTRETTO S SECONDO	Radiologia	Parma	201.910,00 €	0,00 €
D99J22001150001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080003#CASA DI RECLUSIONE DI PARMA	Radiologia	Parma	202.000,00 €	0,00 €
D99J22001160001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	695103#POLIAMBULATORI COLORNO	Radiologia	Colorno	204.000,00 €	0,00 €
D99J22001170001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	170202#POLIAMBULATORI FORNOVO	Radiologia	Fornovo Taro	204.000,00 €	0,00 €
D99J22001180001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	691301#POLIAMBULATORI PARMA OVEST	Radiologia	Parma	204.000,00 €	0,00 €
D94E22000420001	Azienda USL di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080013#OSPEDALE_FIDENZA	Radiologia	Fidenza	202.000,00 €	0,00 €
G89J22001020002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	TAC A 128 STRATI	08002104#OSPEDALE "G.MAGATI" SCANDIANO	Radiologia	Scandiano	320.000,00 €	0,00 €
G89J22001030002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	TAC A 128 STRATI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	329.355,21 €	0,00 €
G89J22001040002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	RMN A 1,5 T	08002105#OSPEDALE "S.ANNA" CASTELNOVO NE MONTI	Radiologia	Castelnovo ne Monti	1.503.292,00 €	0,00 €
G89J22001060002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	187.407,86 €	0,00 €
G89J22001070002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	161.029,68 €	0,00 €
G84E22000500006	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Guastalla	130.202,38 €	0,00 €
G89J22001090002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002104#OSPEDALE "G.MAGATI" SCANDIANO	Radiologia	Scandiano	148.632,31 €	0,00 €
G89J22001100002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002102#OSPEDALE "S.SEBASTIANO" CORREGGIO	Radiologia	Correggio	164.713,10 €	0,00 €
G89J22001110002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002105#OSPEDALE "S.ANNA" CASTELNOVO NE MONTI	Radiologia	Castelnovo ne Monti	164.821,18 €	0,00 €
G89J22001120002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002103#OSPEDALE "E.FRANCHINI" MONTECCHIO	Radiologia	Montecchio Emilia	141.745,70 €	0,00 €
G89J22001130002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002101#OSPEDALE CIVILE GUASTALLA	Radiologia	Guastalla	177.731,64 €	0,00 €
G89J22001150002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	ANGIOGRAFI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Cardiologia	Reggio Emilia	840.287,83 €	0,00 €
G89J22001160002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	ECOTOMOGRAFI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Cardiologia	Reggio Emilia	69.637,05 €	0,00 €
G89J22001170002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	ECOTOMOGRAFI	08002103#OSPEDALE "E.FRANCHINI" MONTECCHIO	Ostetricia e ginecologia	Montecchio Emilia	40.785,15 €	0,00 €
G89J22001180002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	300.362,95 €	0,00 €
G89J22001190002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002102#OSPEDALE "S.SEBASTIANO" CORREGGIO	Radiologia	Correggio	219.783,00 €	0,00 €
G89J22001200002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002104#OSPEDALE "G.MAGATI" SCANDIANO	Radiologia	Scandiano	283.182,00 €	0,00 €
G89J22001210002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002103#OSPEDALE "E.FRANCHINI" MONTECCHIO	Radiologia	Montecchio Emilia	254.683,00 €	0,00 €
G89J22001220002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002105#OSPEDALE "S.ANNA" CASTELNOVO NE MONTI	Radiologia	Castelnovo ne Monti	239.683,00 €	0,00 €
G89J22001230002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002101#OSPEDALE CIVILE GUASTALLA	Radiologia	Guastalla	36.234,00 €	0,00 €
G89J22001240002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002105#OSPEDALE "S.ANNA" CASTELNOVO NE MONTI	Radiologia	Castelnovo ne Mo	36.234,00 €	0,00 €
G89J22001250002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002101#OSPEDALE CIVILE GUASTALLA	Radiologia	Guastalla	216.550,00 €	0,00 €
G89J22001260002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002104#OSPEDALE "G.MAGATI" SCANDIANO	Radiologia	Scandiano	210.409,16 €	0,00 €
G89J22001270002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002105#OSPEDALE "S.ANNA" CASTELNOVO NE MONTI	Radiologia	Castelnovo ne Mo	199.950,00 €	0,00 €
G89J22001280002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	204.350,00 €	0,00 €
G89J22001290002	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08002106#ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO	Radiologia	Reggio Emilia	221.290,00 €	0,00 €
G84E22000370006	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	TAC A 128 STRATI	08002101#OSPEDALE CIVILE GUASTALLA	Radiologia	Guastalla	356.560,33 €	0,00 €
G84E22000360006	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	RMN A 1,5 T	08002101#OSPEDALE CIVILE GUASTALLA	Radiologia	Guastalla	1.553.561,44 €	0,00 €
G84E22000350006	Azienda USL di Reggio Emilia	Bottazzi_Paolo	MAMMOGRAFI	08002104#OSPEDALE "G.MAGATI" SCANDIANO	Radiologia	Scandiano	157.762,18 €	0,00 €
J49J22001110006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	TAC A 128 STRATI	08003109#Ospedale Pavullo nel Frignano	Radiologia	Pavullo nel Frigna	376.249,00 €	0,00 €
J49J22001140006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	RMN A 1,5 T	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Radiologia	Carpi	1.289.175,20 €	0,00 €
J49J22001150006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	RMN A 1,5 T	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Radiologia	Mirandola	1.371.078,18 €	0,00 €
J49J22001160006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	MAMMOGRAFI	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Radiologia	Mirandola	157.605,70 €	0,00 €
J94E22001220006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	MAMMOGRAFI	200002#Casa della salute di Finale Emilia	Radiologia	Finale Emilia	188.497,32 €	0,00 €
J49J22001180006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003109#Ospedale Pavullo nel Frignano	Radiologia	Pavullo nel Frigna	242.247,70 €	0,00 €
J49J22001190006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Radiologia	Mirandola	234.054,40 €	0,00 €
J49J22001200006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003109#Ospedale Pavullo nel Frignano	Radiologia	Pavullo nel Frigna	246.890,00 €	0,00 €
J49J22001210006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Radiologia	Carpi	208.534,25 €	0,00 €
J49J22001220006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Radiologia	Carpi	246.890,00 €	0,00 €

J49J22001230006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003109#Ospedale di Pavullo nel Frignano	Radiologia	Pavullo nel Frigna	254.181,55 €	0,00 €
J49J22001240006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Radiologia	Mirandola	218.621,61 €	0,00 €
J49J22001250006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	200002#Casa della Salute di Finale Emilia	Radiologia	Finale Emilia	206.245,78 €	0,00 €
J49J22001260006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	700001#Casa della salute di Castelfranco Emilia	Radiologia	Castelfranco Emili	160.198,69 €	0,00 €
J49J22001270006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003108#Ospedale di Vignola	Radiologia	Vignola	182.790,87 €	0,00 €
J54E22000680006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003108#Ospedale di Vignola	Radiologia	Vignola	181.848,55 €	0,00 €
J49J22001290006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	300003#Poliambulatorio presso Casa Circondariale di Modena	Radiologia	Modena	143.972,19 €	0,00 €
J49J22001300006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Radiologia	Carpi	160.198,69 €	0,00 €
J49J22001310006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Radiologia	Mirandola	246.890,00 €	0,00 €
J49J22001320006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Ostetricia e ginecologia	Carpi	29.085,00 €	0,00 €
J49J22001330006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Ostetricia e ginecologia	Carpi	30.660,00 €	0,00 €
J49J22001340006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08003105#Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola	Cardiologia	Mirandola	61.762,05 €	0,00 €
J49J22001350006	Azienda USL di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08003104#Ospedale Ramazzini di Carpi	Radiologia	Carpi	24.711,75 €	0,00 €
E39J22001210006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	TAC A 128 STRATI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO	Bologna	428.893,60 €	0,00 €
E29J22000850006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	TAC A 128 STRATI	08005307#OSPEDALE BENTIVOGLIO	RADIOLOGIA	Bentivoglio	474.538,00 €	0,00 €
E59J22000750006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	TAC A 128 STRATI	08005304#OSPEDALE PORRETTA TERME	RADIOLOGIA	Alto Reno Terme	386.690,60 €	0,00 €
E59J22000760006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	TAC A 128 STRATI	08005308#OSPEDALE BUDRIO	RADIOLOGIA	Budrio	387.710,30 €	0,00 €
E59J22000770006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	TAC A 128 STRATI	08005309#OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO	RADIOLOGIA	San Giovanni in P	366.619,63 €	0,00 €
E39J22001220006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	MAMMOGRAFI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	SENOLOGIA	Bologna	168.595,84 €	0,00 €
E39J22001230006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	MAMMOGRAFI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	SENOLOGIA	Bologna	153.824,92 €	0,00 €
E69J22001000006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	MAMMOGRAFI	210101#POLIAMBULATORIO DI SAN LAZZARO	SENOLOGIA	San Lazzaro di Sa	156.776,10 €	0,00 €
E39J22001240006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	MAMMOGRAFI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	SENOLOGIA	Bologna	139.239,82 €	0,00 €
E39J22001250006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ANGIOGRAFI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	Bologna	640.000,00 €	0,00 €
E39J22001260006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ANGIOGRAFI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	Bologna	650.000,00 €	0,00 €
E39J22001270006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	AMB. CHIRURGIA VASCOLARE	Bologna	24.659,25 €	0,00 €
E39J22001280006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	CENTRO ECOGRAFICO	Bologna	24.659,25 €	0,00 €
E39J22001290006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO	Bologna	24.659,25 €	0,00 €
E39J22001300006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	102757# POLIAMBULATORIO CASA DELLA SALUTE NAVILE	RADIOLOGIA	Bologna	24.659,25 €	0,00 €
E39J22001310006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	CENTRO ECOGRAFICO	Bologna	24.659,25 €	0,00 €
E29J22000860006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005307#OSPEDALE BENTIVOGLIO	OSTETRICIA	Bentivoglio	30.481,50 €	0,00 €
E59J22000790006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005309#OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO	GINECOLOGIA	San Giovanni in P	31.836,00 €	0,00 €
E39J22001320006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	000312#CONSULTORIO FAMILIARE CASA DELLA SALUTE NAVILE	CONSULTORIO FAMILIARE	Bologna	31.836,00 €	0,00 €
E49J22000940006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	ECOTOMOGRAFI	08005303#OSPEDALE BAZZANO	AMB. CARDIOLOGICO	Valsamoggia	23.677,50 €	0,00 €
E59J22000800006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005309#OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO	RADIOLOGIA	San Giovanni in P	194.595,38 €	0,00 €
E29J22000880006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005307#OSPEDALE BENTIVOGLIO	RADIOLOGIA	Bentivoglio	198.058,53 €	0,00 €
E39J22001330006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	RADIOLOGIA	Bologna	203.265,70 €	0,00 €
E59J22000810006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005304#OSPEDALE "A. COSTA" PORRETTA TERME	RADIOLOGIA	Alto Reno Terme	196.924,06 €	0,00 €
E39J22001340006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	179.000,00 €	0,00 €
E39J22001350006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	161.578,58 €	0,00 €
E29J22000890006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005305#OSPEDALE VERGATO	RADIOLOGIA	Vergato	179.000,00 €	0,00 €
E59J22000820006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005309#OSPEDALE S. GIOVANNI IN PERSICETO	RADIOLOGIA	San Giovanni in P	183.610,00 €	0,00 €
E39J22001360006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005302#OSPEDALE BELLARIA	RADIOLOGIA	Bologna	174.390,10 €	0,00 €
E39J22001370006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	176.000,00 €	0,00 €
E39J22001380006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	177.000,00 €	0,00 €
E39J22001390006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	177.000,00 €	0,00 €
E39J22001400006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005301#OSPEDALE MAGGIORE	RADIOLOGIA	Bologna	177.000,00 €	0,00 €
E59J22000830006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005308#OSPEDALE BUDRIO	RADIOLOGIA	Budrio	177.562,00 €	0,00 €
E49J22000950006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08005306#OSPEDALE LOIANO	RADIOLOGIA	Loiano	176.000,00 €	0,00 €
E69J22001010006	Azienda USL di Bologna	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	210101#POLIAMBULATORIO DI SAN LAZZARO	RADIOLOGIA	San Lazzaro di Sa	170.000,00 €	0,00 €
H29J22000840006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	MAMMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI RADIOLOGIA	Imola	219.300,60 €	0,00 €
H29J22000850006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI CARDIOLOGIA	Imola	79.612,05 €	0,00 €
H29J22000860006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI CARDIOLOGIA	Imola	79.612,05 €	0,00 €
H29J22000870006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI CARDIOLOGIA	Imola	79.612,05 €	0,00 €
H29J22000880006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO di OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Imola	44.310,00 €	0,00 €
H29J22000890006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO di OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Imola	44.310,00 €	0,00 €
H29J22000900006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO di OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Imola	44.310,00 €	0,00 €
H89J22001220006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004402#OSPEDALE_CASTEL_SAN_PIETRO_TERME	UO di CONSULTORIO FAMILIARE - OSTETRICIA E	Castel San Pietro	44.310,00 €	0,00 €
H29J22000950006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO di OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Imola	37.485,00 €	0,00 €
H29J22000960006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI RADIOLOGIA	Imola	53.812,50 €	0,00 €
H29J22000970006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI GASTROENTEROLOGIA	Imola	53.812,50 €	0,00 €
H29J22000980006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DIPARTIMENTO MEDICO	Imola	29.898,75 €	0,00 €
H29J22000990006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DIPARTIMENTO CHIRURGICO	Imola	51.870,00 €	0,00 €
H29J22001000006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DIPARTIMENTO MEDICO	Imola	35.148,75 €	0,00 €
H29J22001010006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DIPARTIMENTO MEDICO	Imola	29.898,75 €	0,00 €

H29J22001020006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	DIPARTIMENTO MEDICO	Imola	42.787,50 €	0,00 €
H89J22001280006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	ECOTOMOGRAFI	08004402#OSPEDALE_CASTEL_SAN_PIETRO_TERME	DIPARTIMENTO MEDICO	Castel San Pietro	37.485,00 €	0,00 €
H29J22000910006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI RADIOLOGIA	Imola	220.475,96 €	0,00 €
H29J22000920006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08004401#OSPEDALE_CIVILE_NUOVO_"S.MARIA_DELLA_SCALETTA"_IMOLA	UO DI RADIOLOGIA	Imola	232.435,62 €	0,00 €
H89J22001230006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08004402#OSPEDALE_CASTEL_SAN_PIETRO_TERME	UO DI RADIOLOGIA	Castel San Pietro	234.274,16 €	0,00 €
H89J22001240006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08004402#OSPEDALE_CASTEL_SAN_PIETRO_TERME	UO DI RADIOLOGIA	Castel San Pietro	241.201,32 €	0,00 €
E19J22000990006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	MAMMOGRAFI	080068#Ospedale del Delta	Radiologia	Lagosanto	234.228,57 €	0,00 €
E39J22001430006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	MAMMOGRAFI	080068#OSPEDALE SS.ANNUNZIATA CENTO	RADIOLOGIA	Cento	221.203,75 €	0,00 €
E39J22001440006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	341003#POLIAMBULATORIO PRESSO CASA SALUTE DI COMACCHIO	POLIAMBULATORI	Comacchio	28.192,50 €	0,00 €
E59J22000850006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080068#OSPEDALE SS. ANNUNZIATA CENTO	MEDICINA GENERALE	Cento	28.796,25 €	0,00 €
E79J22000950006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	MAMMOGRAFI	106013#AMBULATORIO PRESSO CASA DELLA SALUTE "CITTADELLA S.ROCCO"	RADIOLOGIA	Ferrara	224.502,47 €	0,00 €
E99J22000860006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	RMN A 1,5 T	080068#OSPEDALE MAZZOLANI VANDINI ARGENTA	RADIOLOGIA	Argenta	1.295.887,46 €	0,00 €
E99J22000870006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080068#OSPEDALE MAZZOLANI VANDINI ARGENTA	RADIOLOGIA	Argenta	28.796,25 €	0,00 €
E19J22001000006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080068#OSPEDALE DEL DELTA LAGOSANTO	RADIOLOGIA	Lagosanto	28.796,25 €	0,00 €
E39J22001450006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080068#OSPEDALE SS. ANNUNZIATA CENTO	RADIOLOGIA	Cento	28.796,25 €	0,00 €
E79J22000960006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	106013#AMBULATORIO PRESSO CASA DELLA SALUTE "CITTADELLA S.ROCCO"	RADIOLOGIA	Ferrara	32.366,25 €	0,00 €
E39J22001470006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080068#OSPEDALE SS. ANNUNZIATA CENTO	RADIOLOGIA	Cento	162.361,66 €	0,00 €
E19J22001010006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080068#OSPEDALE DEL DELTA LAGOSANTO	RADOLOGIA	Lagosanto	227.638,34 €	0,00 €
E39J22001480006	Azienda USL di Ferrara	Pirini_Giampiero	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080068#OSPEDALE SS. ANNUNZIATA CENTO	RADIOLOGIA	Cento	230.000,00 €	0,00 €
G64E22000220006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Radiologia	Ravenna	925.639,34 €	0,00 €
G94E22000260006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Radiologia	Rimini	907.514,39 €	0,00 €
G64E22000230006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	08010002#Ospedale Cervesi Cattolica	Radiologia	Cattolica	536.125,00 €	0,00 €
G94E22000270006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Radiologia	Rimini	369.299,34 €	0,00 €
G94E22000280006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Neuroradiologia	Rimini	570.811,93 €	0,00 €
G14E22000430006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08009103#Ospedale Angioloni S. Piero in Bagno	Radiologia	Bagno di Romagn	385.000,00 €	0,00 €
G14E22000440006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini Cesena	Radiologia	Mercato Saraceno	385.000,00 €	0,00 €
G64E22000240006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì	Radiologia	Forlì	220.000,00 €	0,00 €
G64E22000250006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Radiologia	Ravenna	200.000,00 €	0,00 €
G64E22000260006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci ravenna	Radiologia	Ravenna	160.000,00 €	0,00 €
G64E22000270006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Radiologia	Ravenna	305.000,00 €	0,00 €
G64E22000280006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Radiologia	Ravenna	225.000,00 €	0,00 €
G44E22000260006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08009502#Ospedale Franchini S.Arcangelo di Ro	Radiologia	Santarcangelo di	220.000,00 €	0,00 €
G64E22000290006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	RMN A 1,5 T	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni	Radiologia	Forlì	1.524.424,11 €	0,00 €
G64E22000300006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	RMN A 1,5 T	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Radiologia	Ravenna	1.471.202,80 €	0,00 €
G94E22000290006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	RMN A 1,5 T	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Radiologia	Rimini	1.668.804,02 €	0,00 €
G14E22000450006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini cesena	Senologia Cesena	Cesena	135.798,37 €	0,00 €
G64E22000310006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì	Senologia Forlì	Forlì	168.709,64 €	0,00 €
G64E22000320006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì	Senologia Forlì	Forlì	146.175,43 €	0,00 €
G64E22000330006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì	Senologia Forlì	Forlì	131.209,95 €	0,00 €
G44E22000270006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	080079#Ospedale Umberto 1 Lugo	Senologia Lugo	Lugo	196.434,42 €	0,00 €
G24E22000780006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	080082#Ospedale degli Infermi Faenza	Senologia Faenza	Faenza	145.450,73 €	0,00 €
G64E22000340006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Senologia Ravenna	Ravenna	178.419,00 €	0,00 €
G64E22000350006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Senologia Ravenna	Ravenna	141.041,32 €	0,00 €
G94E22000300006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	MAMMOGRAFI	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Senologia Rimini	Rimini	193.227,00 €	0,00 €
G94E22000310006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	ACCELERATORI LINEARI	08009501#Ospedale Infermi Rimini	Radioterapia Oncologia	Rimini	2.417.001,20 €	0,00 €
G14E22000460006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	GAMMA CAMERE/TAC	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini Cesena	Medicina Nucleare	Cesena	522.399,45 €	0,00 €
G64E22000360006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	GAMMA CAMERE	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni	Medicina Nucleare	Forlì	494.461,32 €	0,00 €
G64E22000370006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	GAMMA CAMERE/TAC	08008501#Ospedale Morgagni Pierantoni Forlì	Medicina Nucleare	Forlì	480.439,75 €	0,00 €
G14E22000470006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	GAMMA CAMERE/TAC	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini Cesena	Medicina Nucleare	Cesena	533.496,85 €	0,00 €
G64E22000380006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	ECOTOMOGRAFI	080072#Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna	Ostetricia e Ginecologia	Ravenna	47.586,00 €	0,00 €
G14E22000480006	Azienda USL della Romagna	Scrittori_Nicoletta	ECOTOMOGRAFI	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini Cesena	Cardiologia	Cesena	68.423,25 €	0,00 €
G14E22000420006	Azienda USL della Romagna	Cenni_Paolo	TAC A 128 STRATI	08009101#Ospedale Maurizio Bufalini Cesena	Radiologia PS	Cesena	443.409,63 €	0,00 €
F99J22001150001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	TAC A 128 STRATI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	461.000,00 €	0,00 €
F99J22001160001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	TAC A 128 STRATI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	1.075.000,00 €	0,00 €
F99J22001170001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	RMN A 1,5 T	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Scienze Radiologiche	Parma	1.499.362,56 €	0,00 €
F99J22001180001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	GAMMA CAMERE/TAC	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Medicina Nucleare	Parma	580.000,00 €	0,00 €
F99J22001190001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	GAMMA CAMERE/TAC	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Medicina Nucleare	Parma	578.363,86 €	0,00 €
F99J22001200001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	ANGIOGRAFI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Neuroradiologia	Parma	892.000,00 €	0,00 €
F99J22001210001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	252.000,00 €	0,00 €
F99J22001220001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	210.000,00 €	0,00 €
F99J22001230001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	131.260,00 €	0,00 €
F99J22001240001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Scienze Radiologiche	Parma	156.770,00 €	0,00 €
F99J22001250001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	252.000,00 €	0,00 €
F99J22001260001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Radiologia	Parma	265.000,00 €	0,00 €

F99J22001270001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Scienze Radiologiche	Parma	46.000,00 €	0,00 €
F94E22000510001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	ANGIOGRAFI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Neuroradiologia	Parma	584.000,00 €	0,00 €
F94E22000520001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Berghenti_Matteo	ANGIOGRAFI	080902#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	Neuroradiologia	Parma	508.000,00 €	0,00 €
F99J22001340006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	TAC A 128 STRATI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	445.851,56 €	0,00 €
F99J22001350006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	TAC A 128 STRATI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	445.070,39 €	0,00 €
F99J22001360006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	TAC A 128 STRATI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	394.099,00 €	0,00 €
F99J22001370006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ACCELERATORI LINEARI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radioterapia	Modena	2.151.401,27 €	0,00 €
F94E22000980006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	MAMMOGRAFI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Centro di Senologia	Modena	150.239,34 €	0,00 €
F99J22001390006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	MAMMOGRAFI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	189.558,72 €	0,00 €
F99J22001410006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ANGIOGRAFI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Cardiologia	Modena	665.417,28 €	0,00 €
F99J22001420006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	272.426,00 €	0,00 €
F99J22001430006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	174.826,00 €	0,00 €
F99J22001440006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	217.588,09 €	0,00 €
F99J22001450006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	224.412,90 €	0,00 €
F99J22001460006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	230.885,00 €	0,00 €
F99J22001470006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	230.885,00 €	0,00 €
F99J22001480006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	229.226,52 €	0,00 €
F99J22001490006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	230.881,41 €	0,00 €
F99J22001500006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	217.859,06 €	0,00 €
F99J22001510006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	217.859,06 €	0,00 €
F99J22001520006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	179.281,04 €	0,00 €
F99J22001530006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	210.503,68 €	0,00 €
F99J22001540006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	216.029,06 €	0,00 €
F99J22001550006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Radiologia	Modena	216.029,06 €	0,00 €
F99J22001560006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Cardiologia	Modena	70.140,00 €	0,00 €
F99J22001570006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ECOTOMOGRAFI	08090401#Ospedale Policlinico di Modena	Radiologia	Modena	49.631,79 €	0,00 €
F94E22000540006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ANGIOGRAFI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Cardiologia	Modena	700.857,06 €	0,00 €
F94E22000550006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Martignon_Marco	ANGIOGRAFI	08090402#Ospedale Civile di Baggiovara	Cardiologia	Modena	525.332,00 €	0,00 €
F39J22001110006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	TAC A 128 STRATI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	UO Radiologia - Lovato	Bologna	366.277,00 €	0,00 €
F39J22001120006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	RMN A 1,5 T	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia addomino- pelvica diagn.interv.- Golfieri	Bologna	1.124.840,00 €	0,00 €
F39J22001130006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	PET/TAC	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Medicina Nucleare - Fanti	Bologna	2.295.480,47 €	0,00 €
F39J22001140006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	PET/TAC	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Medicina Nucleare - Fanti	Bologna	2.351.474,16 €	0,00 €
F39J22001150006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	MAMMOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia - Lovato	Bologna	171.715,00 €	0,00 €
F39J22001160006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	MAMMOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia - Lovato	Bologna	200.128,80 €	0,00 €
F39J22001170006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	ANGIOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Cardiologia - Galiè	Bologna	618.738,00 €	0,00 €
F39J22001180006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	ANGIOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Cardiologia - Galiè	Bologna	662.414,00 €	0,00 €
F39J22001190006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	ECOTOMOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia - Lovato	Bologna	22.323,00 €	0,00 €
F39J22001200006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	ECOTOMOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia - Lovato	Bologna	22.323,00 €	0,00 €
F34E22000490006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Lambertini_Paride	ANGIOGRAFI	080908#IRCCS POLICLINICO DI SANT'ORSOLA BOLOGNA	Radiologia addomino- pelvica diagn.interv.- Golfieri	Bologna	789.462,00 €	0,00 €
D39J21023850002	Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS	Bucciarelli_Tullio	RMN A 1,5 T	080960#ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	RADIOLOGIA	Bologna	1.218.483,00 €	0,00 €
D39J21023860002	Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS	Falasca_Giulia	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080960#ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	RADIOLOGIA	Bologna	300.779,87 €	0,00 €
D39J21023870002	Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS	Bucciarelli_Tullio	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080960#ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	RADIOLOGIA	Bologna	186.488,00 €	0,00 €
E79J22000970006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	RMN A 1,5 T	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	NEURORADIOLOGIA	Ferrara	1.319.955,68 €	0,00 €
E79J22000980006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	MAMMOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	SENOLOGIA	Ferrara	264.291,13 €	0,00 €
E79J22000990006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	ANGIOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	EMODINAMICA	Ferrara	670.967,50 €	0,00 €
E79J22001000006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	ANGIOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	NEURORADIOLOGIA	Ferrara	678.837,50 €	0,00 €
E79J22001010006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	SENOLOGIA	Ferrara	28.796,25 €	0,00 €
E79J22001020006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	SENOLOGIA	Ferrara	32.366,25 €	0,00 €
E79J22001030006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	ECOTOMOGRAFI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	CARDIOLOGIA	Ferrara	29.032,50 €	0,00 €
E79J22001040006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	RADIOLOGIA	Ferrara	162.361,66 €	0,00 €
E79J22001050006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	RADIOLOGIA	Ferrara	162.361,66 €	0,00 €
E79J22001060006	Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara	Pirini_Giampiero	GAMMA CAMERE/TAC	080909#AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	MEDICINA NUCLEARE	Ferrara	665.708,87 €	0,00 €

M6 C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Fondi PNRR								
CUP	ENTE del SSR	RUP	Presidio Ospedaliero	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G82C21001070006	Azienda USL di Reggio Emilia	Castellazzi_Davide	OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA (RE) - CORPO	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	Donatori di Sangue ,1	2.489.538,84 €	333.688,15 €
G68I21001140001	Azienda USL della Romagna	Luzi_Francesca	AUSL della Romagna _ Ospedali di Ravenna, Lugo e Rimini	RAVENNA	RAVENNA	Ospedale di Ravenna (Viale Randi 5, 48121 Ravenna) Ospedale di Rimini (Via Settembrini 2 - 47921 Rimini, Ospedale di Lugo (Viale Dante 10, 48022 Lugo))De Gasperi	10.000.000,00 €	3.898.500,00 €
E32C22000040001	Azienda USL di Bologna	Francavilla_Francesco Maria	OSPEDALE BELLARIA PADIGLIONE C	BOLOGNA	BOLOGNA	ALTURA ,3	9.800.000,00 €	883.078,00 €
F31B22000330001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Boschetti_Simona	Padiglione 26 - Palazzina ambulatori	BOLOGNA	BOLOGNA	Albertoni ,15	9.725.000,00 €	1.700.000,00 €
G92C21000760001	Azienda USL di Reggio Emilia	Brugè_Davide	OSPEDALE S'ANNA DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO NE' MONTI	REGGIO NELL'EMILIA	Roma ,2	7.270.000,00 €	837.683,78 €
G82C21001080001	Azienda USL di Reggio Emilia	Sciuto_Giuseppe	OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA (RE) - CORPO	GUASTALLA	REGGIO NELL'EMILIA	via Donatori di Sangue ,1	2.750.000,00 €	379.504,87 €
H22C22000050001	Azienda USL di Imola	Faiello_Domenico Alessandro	Ospedale di Imola	IMOLA	BOLOGNA	Montericco ,4	1.400.000,00 €	140.000,00 €

M6 C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (ex PNC) - Fondi Art. 20 L. 67/1988, come previsto dall'art. 1, comma 13, DL 19/2024								
CUP	ENTE del SSR	RUP	Presidio Ospedaliero	Comune	Provincia	Indirizzo	IMPORTO INTERVENTO ART. 20	IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)
G61B21011090001	Azienda USL della Romagna	Montalti_Alessandra	NUOVO PADIGLIONE Ospedale Morgagni Pierantoni Di Forlì	FORLÌ	FORLÌ-CESENA	Carlo Forlanini ,34	8.058.707,52 €	4.120.408,00 €
G91B21007650001	Azienda USL della Romagna	Carlini_Laura	NUOVO PADIGLIONE Ospedale Infermi di Rimini	RIMINI	RIMINI	settembrini ,2	22.800.471,66 €	7.630.221,79 €
F91B21006130001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma	Saviano_Renato Maria	Nuovo Ospedale delle Mamme	PARMA	PARMA	Via Gramsci ,14	21.500.000,00 €	7.951.039,50 €
F91B21006050001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena	Scabbia_Marco	Policlinico Modena	MODENA	MODENA	del Pozzo ,71	10.800.000,00 €	8.000.000,00 €
F32C22000020001	Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS	Murgo_Francesco Saverio	Padiglione 3 - Polo della Ricerca Scientifica	BOLOGNA	BOLOGNA	Albertoni ,15	4.500.000,00 €	688.000,00 €
D32C21001680001	Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS	Bellettato_Gerardo	Istituto Ortopedico Rizzoli	BOLOGNA	BOLOGNA	Cesare Pupilli ,1	19.845.000,00 €	8.155.000,00 €
E91B20001150001	Azienda USL di Ferrara	Peressotti_Giovanni	Ospedale "Mazzolani-	ARGENTA	FERRARA	Via Nazionale ,5	11.100.000,00 €	3.006.877,13 €

M6C2 1.3.2.2.1 Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali				
CUP	**ENTE del SSR**	**RUP**	**IMPORTO INTERVENTO PNRR**	**IMPORTO INTERVENTO (Altre fonti)**
E37H23000600001	Regione Emilia Romagna	Cisbani_Luca	400.000,00 €	0,00 €
B39I23000980006	Azienda USL di Piacenza	Fabio_Zazzera	207.500,00 €	0,00 €
D27H23000560001	Azienda USL di Parma	Brambilla_Marco	207.500,00 €	0,00 €
G89I23000610006	Azienda USL di Reggio Emilia	Foracchia_Marco	207.500,00 €	0,00 €
J44E23000080006	Azienda USL di Modena	Viani_Simona	207.500,00 €	0,00 €
E34E23000080006	Azienda USL di Bologna	Ghedini_Pierfrancesco	207.500,00 €	0,00 €
H25F23000170006	Azienda USL di Imola	Chiarini_Cristian	207.500,00 €	0,00 €
E79I23000370002	Azienda USL di Ferrara	Cavallarin_Maria Cristina	207.500,00 €	0,00 €
G17H23000720006	Azienda USL della Romagna	Rossi_Lorenzo	207.987,33 €	0,00 €

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Gamberini, Responsabile di SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, INFRASTRUTTURE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/56

IN FEDE

Maria Gamberini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/56

IN FEDE

Luca Baldino

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
